





67018 - 31880





جامعة سلمان بن عبدالعزيز Salman bin Abdulaziz University





" واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون " سبحانه تعالى أنعم وأجزل ، وهب وأكرم . " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " فالشكر له سبحانه على نعمه . " ولئن شكرتم لأزيدنكم " .

إن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة واسعة في جميع المجالات وفي جميع الميادين ولعل التعليم العالي حظي بالحظ الأوفر منها ولله الحمد. ولعل ما نشهده في جامعة سلمان بن عبد العزيز من تطور ملموس وعناية خاصة من لدن وزارة التعليم العالي حيث المنشآت والمشاريع والتوسع الملحوظ فيها والتي بإذن الله ستثمر في بناء الإنسان السعودي من خلال استفادة أبنائنا الطلاب منها سيكون له الأثر الإيجابي في بناء مسيرتهم التعليمية، لذلك فإنني أقدم الشكر الجزيل لوكيل الجامعة ومن عمل معه في إصدار هذا التقرير الإحصائي الذي يوضح مدى استفادة الجامعة من ميزانيتها منذ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي ١٤٣٤ / ١٤٣٥ هـ والذي يرصد ما تم إنجازه من مشاريع حيوية.

وأخيراً أسأل الله عز وجل أن ينفع بالجهد وأن يكلل العمل بالأثر الإيجابي الملموس والذي يسهم في خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.

معالي مدير الجامعة د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي



جامعة سلمان بن عبدالعزيز Salman bin Abdulaziz University





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...
فمن المؤكد أن العلم هو الوسيلة الوحيدة لارتقاء الأمم وتقدمها وعزها ومنعتها، لذا اهتمت الدول قاطبة بتطوير مؤسساتها التعليمية عموماً، والجامعات منها على وجه الخصوص، لأنها المفصل المؤثر في مسيرة الشباب الأكاديمية ومستقبلهم العملي، وما يترتب على ذلك من آثار إبحابية على المحتمع والأمة.

ولقد أدركت جامعة سلمان بن عبد العزيز هذه الحقيقة، فعملت جاهدة منذ نشأتها وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية بقيادة وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي على تعزيز إمكاناتها، وتطوير خططها وبرامجها، واستكمال واستحداث كافة الوحدات والإدارات التي من شأنها تطوير البنية التحتية للجامعة والعمل على الاستفادة بكل ما هو متاح لإحداث جودة في الأداء الإداري، ويتجلى ذلك في إنسيائية العمل الأكاديمي في الحامعة.

فإنه يسرني أن أقدم للقارئ الكريم تقريراً إحصائياً عن أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في جامعة سلمان بن عبد العزيز التي أتت نتيجة سلسلة من الاهتمامات والتخطيط الاستراتيجي الذي يحمل رؤية ورسالة وأهداف واضحة لنستشعر مقدار الأمانة الملقاة على عاتق الجامعة التي تضم بين جنباتها زهاء عشرين كلية وقرابة اثنين وعشرين ألف طالب وطالبة، لذا بادر المسؤولون فيها إلى بذل قصارى جهدهم للقيام بمسؤولياتهم على الوجه اللائق، وفقاً للأمانة وتطلعاً لتخريج أجيال ذوي كفاءات عالية، ومهارات متقدمة، يخدمون مجتمعهم، ويسهمون في مسيرة النهضة التي تشهدها بلادنا المباركة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.

ولقد اعتمد للجامعة في عامها الأول ٢٠١٠ ميزانية بمقدار (٤٦٥,٣٧٣,٠٠٠) ريال، وفي العام الثاني ٢٠١١ ميزانية بمقدار (٦٢٤,٦٦٢,٠٠٠) ريال، وفي العام الثالث ٢٠١٢ ميزانية بمقدار (٨١٢,١١٦,٠٠٠) ريال، وفي عامها الرابع ٢٠١٣ (١,٢٣٩,٦٧٥) .

وتطبيقاً لمبدأ الوضوح والشفافية حرصت وكالة الجامعة على إصدار تقرير إحصائي يبرز مسيرة الجامعة في أعوامها الأربعة ويعرف بأبرز المشاريع الحيوية والتنموية التي من شأنها خدمة العملية التعليمية، أو المشاريع التي تم اعتمادها، مشفوعة بالبيانات والإحصاءات اللازمة، آملين أن يجد فيه منسوبو الجامعة والمهتمون بشؤونها بغيتهم، وأن يرقى إلى مستوى تطلعاتهم وآمالهم.

وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوكلاء الجامعة والعمداء ووكلائهم وكافة منسوبي الجامعة من أكاديميين وإداريين الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات. سائلين الله تعالى دوام التوفيق والسداد للجميع.

وكيل الجامعة د. عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري



فهرس المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	è
۲۰-۱۰	عرض لميزانيات الأعوام الأربعة	1
51	الباب الأول: المشاريع الإنشائية	٢
٢٣	(ملخص الباب)	٣
٤٣-٢٥	الفصل الأول: المشاريع الإنشائية المنجزة	٤
۵۹-٤۵	الفصل الثاني: مشاريع إنشائية تحت التنفيذ	۵
75-11	الفصل الثالث: المشاريع الإنشائية المستقبلية	1
٦٥	الباب الثاني: المشاريع التقنية	٧
11	(ملخص الباب)	٨



فهرس المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	۴
۸۱-٦٩	الفصل الأول: المشاريع التقنية المنجزة	٩
۸۵-۸۳	الفصل الثاني: المشاريع التقنية تحت التنفيذ	1 •
^9-^	الفصل الثالث: المشاريع التقنية المستقبلية	11
91	الباب الثالث: التجهيزات	۱۲
94	(ملخص الباب)	۱۳
101-90	جداول الخاصة بالباب بالتجهيزات	1 £
171-109	الرسومات البيانية	۱۵



خامعة سلمان بن عبدالعزيز Salman bin Abdulaziz University





توزيع الاعتمادات المالية للميزانية حسب الأبواب للعام المالي ١٤٣١ ـ ١٤٣٢هـ

المعتمد في الميزانية بعد التعديل*	المعتمد في الخطة التشغيلية	المبيــــان
112, 1.1, 170	181,027,	الباب الأول
7.11,779,	721,077,	البابالثاني
19,,	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	الباب الثالث
۲۷,۲۳۳,۰۰۰	٥٧,١٩٤,٠٠٠	الباب الرابع
0	٤٦٥,٣٧٣,٠٠٠	الإجمالي

^{*} التعديل يشمل المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وكذلك عمليات التعزيز التي جرت لبعض أبواب الميزانية.



مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي لأبواب الميزانية للعام المالي ١٤٣١ ـ ١٤٣٢هـ

المنصرف الفعلي	المعتمد في الميزانية بعد التعديل *	المعتمد في الخطة التشغيلية	البيان
Y17,•Y7,17Y,•9	718,701,700	181,027,	اثباب الأول
۲۷۹,۷۳۷,۱۲۷,۳۰	441,749,	721,077,	الباب الثاني
17,891,992,00	19,,	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	الباب الثالث
77,777,270,71	۲۷,۲۳۳,۰۰۰	٥٧,١٩٤,٠٠٠	الباب الرابع
081,740,719,87	0	٤٦٥,٣٧٣,٠٠٠	الإجمالي

^{*} التعديل يشمل المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وكذلك عمليات التعزيز التي جرت لبعض أبواب الميزانية.



توزيع الاعتمادات المالية للميزانية حسب الأبواب للعام المالي ١٤٣٢ ـ ١٤٣٣هـ

المعتمد في الميزانية بعد التعديل *	المعتمد في الخطة التشغيلية	البيان
,,***	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	البابالأول
٣١٤,٩٠٥,٠٥٠	779,	الباب الثاني
TT, 1TA, • • •	T0,7TA,	البابالثالث
170,.98,	177, 77,	اثباب اثرابع
٧٩٠,٤١٣,٤٣٧	775,777,	الإجمالي

^{*} التعديل يشمل المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وكذلك عمليات التعزيز التي جرت لبعض أبواب الميزانية.



مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي لأبواب الميزانية للعام المالي ١٤٣٢ ـ ١٤٣٣هـ

المنصرف الفعلي	المعتمد في الميزانية بعد التعديل *	المعتمد في الخطة التشغيلية	البيسان
*********	****,****	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	الباب الأول
٣١٣, ٩٤٠,٩٣١,١٠	٣١٤,٩٠٥,٠٥٠	YV9 ,,	الباب الثاني
TY, 12, 917, 0V	٣٣,٦٣٨,٠٠٠	70,771,	الباب الثالث
180,071,198,90	170,.98,	177, . 77,	البابالرابع
٧٦٨,٧٠٤,٧١٢,٥٩	٧٩٠,٤١٣,٤٣٧	778,777,***	الإجمالي

^{*} التعديل يشمل المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وكذلك عمليات التعزيز التي جرت لبعض أبواب الميزانية.



توزيع الاعتمادات المالية للميزانية حسب الأبواب للعام المالي ١٤٣٣ ـ ١٤٣٤هـ

المعتمد في الميزانية بعد التعديل *	المعتمد في الخطة التشغيلية	البيـــان
٤١٤,٦٩٥,٠٠٠,٠٠	**********	الباب الأول
۳۵۰,٦٥٤,٧٧٨,٠٠	۳۰۵,٦٩٤,٠٠٠,۰۰	الباب الثاني
04,414,,	00, • ٣٨, • • • , • •	الباب الثالث
۲۱۹,۲۲۲,۲۲۲,••	YYW,WA£, • • • , • •	الباب الرابع
1,. ٣٧,٧٨٥,	۸۱۲,۱۱٦,۰۰۰,۰۰	الإجمالي

^{*} التعديل يشمل المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وكذلك عمليات التعزيز التي جرت لبعض أبواب الميزانية.



مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي لأبواب الميزانية للعام المالي ١٤٣٣ ـ ١٤٣٤هـ

المنصرف الفعلي	المعتمد في الميزانية بعد التعديل *	المعتمد فخ الخطة التشغيلية	البيان
٤١٤,٣٩٩,٢٩٦,٩٣	٤١٤,٦٩٥,٠٠٠,٠٠	**********	الباب الأول
٣٤٢, ٦٦٤,٤١٨,•٧	70. ,70£, 7 VA,	۳۰۵,٦٩٤,٠٠٠,۰۰	الباب الثاني
۳۸,۲۱۹,۷۹۰,۵۷	04,414,,	٥٥,٠٣٨,٠٠٠,٠٠	الباب الثالث
100,077,77.,0	۲۱۹,۲۲۲,۲۲۲, ••	۲۲۳,۳۸٤,٠٠٠,٠٠	الباب الرابع
900,007,070,77	١,٠٣٧,٧٨٥,٠٠٠	۸۱۲,۱۱٦,۰۰۰,۰۰	الإجمالي

^{*} التعديل يشمل المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وكذلك عمليات التعزيز التي جرت لبعض أبواب الميزانية.



توزيع الاعتمادات المالية للميزانية حسب الأبواب للعام المالي ١٤٣٥ ـ ١٤٣٥هـ

المعتمد في الميزانية بعد التعديل *	المعتمد في الخطة التشغيلية	البيان
٤٥٦,٥٠٢,٠٠٠	TAT, ,	البابالأول
٤١٢,٣٤٩,٠٠٠	۳۹۳,۱۸۱,۰۰۰	الباب الثاني
٧٤,٠١٠,٠٠٠	٧٤,٤١٠,٠٠٠	الباب الثالث
۳۸۹,۰۸٤,۰۰۰	۳۸۹,۰۸٤,۰۰۰	اثباب اثرابع
1,771,980,	1,779,770,	الإجمالي

^{*} التعديل يشمل المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وكذلك عمليات التعزيز التي جرت لبعض أبواب الميزانية.



مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي لأبواب الميزانية للعام المالي ١٤٣٥ ـ ١٤٣٥هـ

المنصرف الفعلي	المعتمد في الميزانية بعد التعديل *	المعتمد في الخطة التشغيلية	ا ثبيــــان
٤٥٣,٨٦٠,٦٩٥,٧٩	٤٥٦,٥٠٢,٠٠٠	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	الباب الأول
۳۹۸,۷۷۰,۲۹۵,٦٢	٤١٢,٣٤٩,٠٠٠	٣٩٣ ,1٨1,	الباب الثاني
71,789,077,07	٧٤,٠١٠,٠٠٠	٧٤,٤١٠,٠٠٠	الباب الثالث
777,771,£70,9£	٣٨٩,٠٨٤,٠٠٠	۳۸۹,۰۸٤,۰۰۰	البابالرابع
1,100,717,000,77	1,771,980, • • •	1,789,770,	الإجمالي

^{*} التعديل يشمل المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وكذلك عمليات التعزيز التي جرت لبعض أبواب الميزانية.



ملخص لمشاريع الباب الرابع في ميزانيات الجامعة بداية من العام المالي ١٤٣٥/١٤٣١هـ حتى العام المالي ١٤٣٥/١٤٣١هـ

(آلاف الريالات)

إجمالي المعتمد للمشاريع	إجمالي عدد المشاريع	المبلغ المعتمد	مشاريع جديدة	المبلغ المعتمد	مشاريع تحت التنفيذ	ميزانية العام المالي
1,770,***	١٤	98.,	٨	TE0, · · ·	٦	۵۱٤٣٢/١٤٣١
۲,۳۰٦,۰۰۰	٣٢	9.0,	١٨	1, 2 • 1, • • •	١٤	△١٤٣٣/١٤٣٢
٣,٤٧٥,٠٠٠	٥٠	1,188,***	١٨	7,781,	٣٢	۵۱٤٣٤/١٤٣٣
٤,٨٨٧,٠٠٠	٥٥	1,780,000	10	٣,٦٥٧,٠٠٠	٥٠	۵۱٤٣٥/١٤٣٤




ملخص لبرامج وعقود التشغيل والصيانة والنظافة في الباب الثالث في ميزانيات الجامعة بدايةً من العام المالي ١٤٣٢/١٤٣١هـ حتى العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٤هـ

(آلاف الريالات)

إجمالي المعتمد	إجمالي عدد البرامج وعقود التشغيل والصيانة والنظافة	ميزانية العام المالي
٥٦,٧٦١	٨	₾١٤٣٢/١٤٣١
1,177	1 8	۵۱٤٣٣/١٤٣٢
190,112	*1	<u> </u>
777,VA9	٣٢	۵۱٤٣٥/١٤٣٤



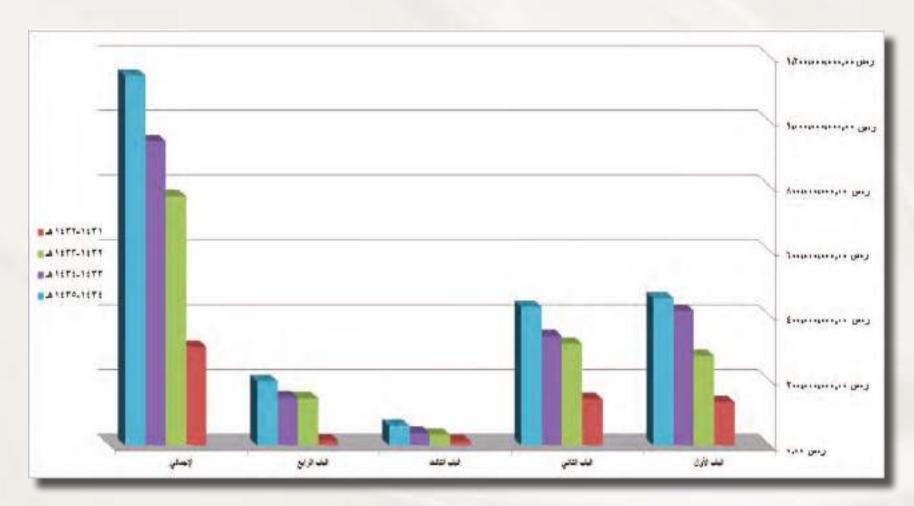

رسم بياني يوضح حجم الانفاق في الأعوام المالية ١٤٣١-١٤٣٨ إلى ١٤٣٤-١٤٣٥هـ



- مشاریع مُنجَزة
- مشاريع تحت التنفيذ
 - مشاريع مستقبلية





المشاريع الإنشائية:

تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم مقومات التعليم العالي حيث توفر البيئة المناسبة لمنسوبي الجامعة بشكل عام وللطالب على وجه الخصوص لرفع قدرته التحصيلية في مختلف أوجه التعليم والمعرفة حيث تهتم المشاريع الإنشائية في المقام الأول بالبنية التحتية لكافة مرافق الجامعة بالإضافة إلى إنشاء المباني الإدارية والأكاديمية ومباني الخدمات وقد حرصت الجامعة منذ نشأتها على توفير العديد من المشاريع التي تخدم في الأساس العملية التعليمية بإشراف الإدارة العامة للمشاريع والصيانة بالجامعة إحدى الإدارات المساندة لوكالة الجامعة أو بالتعاون مع إدارة المشاريع بوزارة التعليم العالي، وجاءت محصلة المشاريع بالجامعة مع نهاية العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ (٥١) مشروعاً وهي على النحو التالي:

التكلفة (ريال)	عدد المشاريع	نوعية المشاريع
۸۱۱,۳۱۷,۰۰۳	٦	المشاريع المنجزة
1,774,184,977	17	مشاريع تحت التنفيذ
1,927,	40	مشاريع مستقبلية
٤,٥٢٦,٤٥٥,٩٢٥	٥١	إجمائي عدد المشاريع









ا <u>لم وقع</u>	التكلفة المعتمدة	اسم المشروع
المدينة الجامعية بالخرج	178,,	كلية المجتمع (بنين)
المدينة الجامعية بالخرج	114, ,	كلية العلوم والدراسات الإنسانية (بنين)
المدينة الجامعية بالخرج	18.,70,771	كلية الهندسة (بنين)
المدينة الجامعية بالخرج	118,.77,777	كلية العلوم الطبية التطبيقية
المدينة الجامعية بالخرج	770, ,	إسكان أعضاء هيئة التدريس واسكان الطلاب (المرحلة الأولى)
المدينة الجامعية بالخرج	10,,	حماية الحرم الجامعي من السيول



1/1/1

الشاريع الإنشائية المنجزة

كلية المجتمع (بنين)

موقع المشروع: المدينة الجامعية بالخرج


نَارِينَ بِدَايِهُ الْعَمِلُ : ٢١/ ٤٠/ ١٢١هـ ٢٠/ ٥٠/ ٢٠٠٦م

نَارِينَ نَهَايِهُ العمل: ١٩/ ٣ / ١٩٨هـ ٢٠١٢ / ٢٠١٢م

النكلفة الإجمالية : ١٦٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال

مكونات المشروع: ثلاثة طوابق كما هي موضحه في الجدول التالي:



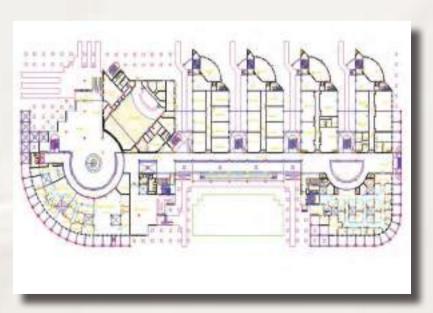



العدد	مكوناته	مساحته	الطابق
٥	قاعات محاضرات مختلفة السعة.	۲۹۷۲۹	
١٦	معامل (لغة انجليزية، حاسب آئي، أحياء، كيمياء، فيزياء)		
٧	استدیوهات (رسم، صوتیات ومرئیات)		
۲	قاعات لورش العمل.		الأرضي
٤	جلسة للطلاب.		
١	مركز للخدمات الطبية		
١	مقر لبيع مستلزمات الطلاب		
١	نافورة		
١	كافتيريا		
١	قاعة لتناول الوجبات الخفيفة.		
01	مكاتب واستراحة أعضاء هيئة التدريس، ومكاتب إدارية		
٣٦	قاعات محاضرات (صغيرة، متوسطة، كبيرة).		
٥١	مكاتب أعضاء هيئة التدريس.	۲۵۱۲۱۲۲٫۸۱	الاول
٢	مستودع .		



العدد	مكوناته	مساحته	الطابق
1	مركز الحاسب الآلي.		الاول
٤	جلسة للطلاب.	۲۱۲۱۲۲٫۸۱	
1	صائة عامة		
١	كافتيريا		
**	مكاتب واستراحة أعضاء هيئة التدريس		الثاني
٤٢	قاعات محاضرات (صغيرة، متوسطة، كبيرة)		
٤	جلسة لأعضاء هيئة التدريس		
١	قاعة اجتماعات مجلس الكلية	Y21775V 15	
1	وقاعة اجتماعات	۲۱۲۶۴۷,۱٤ م۲	
١	مسجد		
4	كافتيريا		
٦	مكتب للعميد وللسكرتارية ومكتب للوكيل والسكرتارية ومكتب لرئيس القسم.		



Y / **1** / **1**

الشاريع الإنشائية النجزة

كلية العلوم والدراست الإنسانية (بنين)


موقى المشروع: المدينة الجامعية بالخرج

نَارِيخَ بِدَايِهُ العمل: ٢١/ ٤٠ / ١٤١٧هـ ٢٠ / ٥٠ / ٢٠٠٦م

نَارِيحُ نَهَايِهُ العمل: ٣٠ / ١١ / ٢٣٢هـ ٢٠١١/١٠ م

النكلفة الإجمالية: ١١٣,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال

مكونات المشروع: ثلاثة طوابق كما هي موضحه في الجدول التالي:

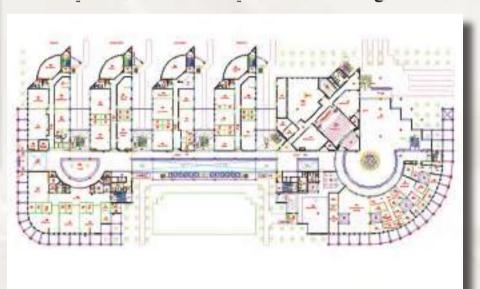





العدد	مكوناته	مساحته	الطابق
1	قاعة مناقشة الرسائل العلمية		الأرضي
1	قاعة محاضرات سعة ٢٠٠ طالب (مدرج)		
1	قاعة وجبات خفيفة	7711977	
1 🗸	معامل بحوث وتدريب		
۵۱	مكاتب المشرفين والموظفين وإدارة شؤون الطلاب وإدارة المعامل و الموظفين.		
٣٠	قاعات محاضرات (صغيرة، متوسطة، كبيرة)		الاول
٤	معامل بحوث وتدريب		
1	معمل محاكاة الفلك	۲۳۱۲۲۲,۸۱	
1	كافتيريا		
۵۱	مكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكاتب الإدارية		
1	قاعة دراسية سعة ١٥ طالب		
٣	قاعات دراسية سعة ٣٥ طالب	۲۵۱۲٦٤۷,۱٤	الثاني
1	معمل سمعيات وبصريات		
٢	قاعات اجتماعات		
1	قاعة انتظار		
٨	المكاتب الإدارية (عمادة الكلية-وكلاء الكلية-السكرتارية)		



0/1/1

المشاريع الإنشائية المنجزة

व्यव्हें अर्थे । विक्र المدينة الجامعية بالخرج

11 /r / A731a

ناريخ بداية العمل: ۲۰۰۷/۷/۱ ناريخ نهاية العمل: ۱۰ ۱۱/۱۲/۱۰م A1877 / 1 / 10 النكلفة الإجمالية : ۱٤٠,٢٨٣,٢٣١ مليون ريال

مكونات المشروع: يتكون من ثلاث طوابق ويبلغ مسطح المباني ٩٣٨٣ ٥٥٢ وتحتوي الكلية على عدد (٦) أقسام تخصصية موضحة في الجدول التالى:





العدد	مكوناته	القسم
٨	قاعات دراسية	
٩	معامل	
**	مكاتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين	
١٠	المكاتب الإدارية	
1.	مخازن	١-الهندسة الالكترونية
١	مكتب رئيس القسم والسكرتارية	
١	قاعة اجتماعات	
١	غرفة لتصوير المستندات	
١.	استراحة لأعضاء هيئة التدريس	
١٨	قاعات دراسية	
٥	معامل	
77	مكاتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين	٢–الهندسة المدنية
٥	المكاتب الإدارية	and and - 1
١٠	المخازن	
1	قاعة اجتماعات	



العدد	مكوناته	القسم	
١	غرفة لتصوير المستندات.		
١	مكتب رئيس القسم ، والسكرتارية	٢-الهندسة المدنية	
١	استراحة لأعضاء هيئة التدريس		
١٣	قاعات دراسية		
٦	معامل		
٥	استديو هات		
10	مكاتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين	٣–الهندسة الميكانيكية	
٣	المكاتب الإدارية		
٥	المخازن		
٧	دورات مياه		
عات، وغرفة	بالإضافة إلى استراحة لأعضاء هيئة التدريس، ومكتب رئيس القسم، والسكرتارية، وقاعة إجتماء		
	لتصوير المستندات.		
۲.	قاعات دراسية		
٦	معامل	***************************************	
١٤	مكاتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين	٤-الكيمياء والتعدين	
٧	المكاتب الإدارية		



العدد	مكوناته	القسم
٤	المخازن	
٧	دورات میاه	٤-الكيمياء والتعدين
عات، وغرفة	بالإضافة إلى استراحة لأعضاء هيئة التدريس، ومكتب رئيس القسم، والسكرتارية، وقاعة إجتما	<u> </u>
	لتصوير المستندات.	
٤	قاعات دراسية	
٧	معامل	
٥	استديوهات	
44	مكاتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين	
٤	المكاتب الإدارية	ه-الهندسة المعمارية
٤	المخازن	
٧	دورات مياه	
مات، وغرفة	بالإضافة إلى استراحة لأعضاء هيئة التدريس، ومكتب رئيس القسم، والسكرتارية، وقاعة إجتماء	
	لتصوير المستندات.	
۱۳	قاعات دراسية	
٩	معامل	٦-الهندسة الكهربائية
**	مكاتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين	



العدد	مكوناته	القسم
٧	المكاتب الإدارية	
٤	المخازن	
٧	دورات مياه	٦-الهندسة الكهربائية
ات، وغرفة	بالإضافة إلى استراحة لأعضاء هيئة التدريس، ومكتب رئيس القسم، والسكرتارية، وقاعة إجتماع	
	لتصوير المستندات.	
19	قاعات دراسية	
*	معامل	
۲	مكاتب إدارية إضافية	
1.	مكاتب إدارية (عمادة الكلية ، الوكلاء ، السكرتارية)	المنطقة الإدارية
٤	قاعات اجتماعات	
٦٢	غرف إضافية (إدارية وخدمية)	
1.	دورات مياه	







*/1/1

الشريع الإنشائية المنجزة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

موقع المشروع: المدينة الجامعية بالخرج

نَارِيخَ بِدَايِةَ الْعَمَلُ : ١/ ٦/ ١٨ ١٤هـ ١١/٦٠ / ٢٠٠٧م

نَارِينَ نَهَايِهُ العَمَلُ اطْنُوفَعَ : ٥ / ٢ / ١٣٤٤هـ ١٩ / ١٠١٢ م

النكلفة الإجمالية: ١١٤,٠٣٣,٧٧٢ مليون ريال







القسم	مكوناته	العدد
	قاعات دراسية صغيرة ومتوسطة	٦
١-١ لمناعة	معامل	٧
	مختبرات	٤
٢-تقنية الأجهزة الطبية	قاعات دراسية صغيرة ومتوسطة	٩
۱-نفنیه الاجهره انطبیه	معامل	٧
	قاعات دراسية صغيرة ومتوسطة	۲
٣-الأشعة	معامل	٤
	مختبرات	٥
	قاعات دراسية صغيرة ومتوسطة	٦
٤-الطب الطبيعي والرياضي	معامل	٧
	مختبرات	*



العدد	مكوناته	القسم	
۲.	قاعات دراسية صغيرة ومتوسطة	. (
٥	معامل	ه-صحة الأسنان	
١٠	قاعات دراسية صغيرة ومتوسطة		
۲	معامل	٦-المختبرات الطبية وأمراض الدم	
٧	مختبرات		

- إجمالي عدد القاعات الدراسية بالكلية (٥٣) قاعة.
 - إجمالي عدد المعامل بالكلية (٥٥) معمل.
 - إجمالي سعة الكلية للطلاب (١٩١٠) طالب.
- إجمائي عدد المكاتب لأعضاء هيئة التدريس والإداريين (٣٥٩) مكتب.







٤/1/1

الشريع الإنشائية المنجزة

إسكان هيئة التدريس وإسكان الطلاب (المرحلة الأولى)

موقع المشروع: المدينة الجامعية بالخرج

نَارِيخُ بِدَايِةُ العمل : ١/ ١١ / ١٢٨ ١٤٢٨ ١١ / ١١ / ٢٠٠٧م

ناريخ نهاية العمل: ١٠/٠٠/ ١٤٣٤هـ ١٠/ ٢٠١٣م

النكلفة الإجمالية : ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠

ينكون المشروع من:

١ / إسكان أعضاء هيئة التدريس ويشتمل على فئتين على النحو التالى:

- فئة (أ): تتكون من عدد (٤) مبانٍ ، كل مبنى عبارة عن أربعة أدوار وكل دور يمثل وحدة واحدة بمساحة (٨٥٥٠) وعدد الوحدات للفئة (أ) بالمرحلة الأولى هو (١٦) وحدة .
- فئة (ب): تتكون من عدد (٢) مبنى من أصل (٢٢) مبنى ويتكون كل مبنى من خمسة أدوار ، كل دور يتكون من وحدتين مساحة كل وحدة (٢٤٠م٢) و عدد الوحدات للفئة (ب) بالمرحلة الأولى هو (٢٢٠) وحده.





\$ / 1 / 1

المشاريع الإنشائية تحت التنفيذ

إسكان هيئة التدريس وإسكان الطلاب (المرحلة الأولى)



٢ / إسكان الطلاب:

يتكون من عدد (٢) مبنى، كل مبنى يتكون من ثلاثة أدوار حيث يحتوي كل مبنى على (١١٠) وحدة سكنية ومساحة الوحدة الواحدة (٣٠ م٢) تقريباً وتسع الوحدة عدد (٣) طلاب وبالتالي فإن سعة إسكان الطلاب بالمرحلة الأولى حوالي (٦٦٠) طالب تقريباً.







الموقع	التكلفة المعتمدة	اسم المشروع
الدثم	117, 8 • 7, 701	كلية التربية للبنات
المدينة الجامعية بالخرج	* 70, · · · , · · ·	إسكان أعضاء هيئة التدريس واسكان الطلاب (المرحلة الثانية)
المدينة الجامعية بالخرج	77,987,70	المباني المساندة
محافظة وادي الدواسر	178,877,77.	الموقع العام وكلية العلوم والآداب
المدينة الجامعية بالخرج	119,0000	الموقع العام والبنية التحتية (المرحلة الثانية)
المدينة الجامعية بالخرج	177,711,710	الموقع العام والبنية التحتية (المرحلة الثالثة)
المدينة الجامعية بالخرج	0 • , • • • , • • •	مبنى معامل كلية الهندسة
المدينة الجامعية بالخرج	177,,	كلية علوم الحاسب الآلي- بنين
المدينة الجامعية بالخرج	2 * , * * * , * * *	المحتبة المركزية
المدينة الجامعية بالخرج	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	مبنى التشغيل والصيانة
المدينة الجامعية بالخرج	1,,	البنية الأساسية وخدمات لموقع مجمع الكليات الصحية
الخرج، الحوطة ، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	إعادة تأهيل كليات البنات
محافظة وادي الدواسر	10.,,	كلية الهندسة بنين
محافظة وادي الدواسر	11.,,	الموقع العام وكلية التربية- بنات
محافظة وادي الدواسر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	إنشاء محطة الكهرباء المحورية
السليل	1,,	إنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية (بنات)
المدينة الجامعية بالخرج	0,***,***	تصميم وإنشاء مظلات بمواقف المدينة الجامعية



1/ 7 / 1

الشريع الإنشائية تحت التنفيذ

كلية التربية للبنات


موقع المشروع: شرق مدينة الدلم – محافظة الخرج

نَارِيحُ بِدَايِهُ العمل : ٢٠١١ م / ١٤٣٢هـ ٢٤ / ٢٠١١م

نَارِيحُ نَهَايِهُ العَمَلُ الْمُنُوفَى : ١٩/٥/٥٣١هـ ٢٠١٤م

النكلفة الإجمالية المنوقعه : ١١٢,٤٠٢,٦٥٨ مليون ريال

مكونات المشروع: ثلاثة طوابق كما هي موضحه في الجدول التالي:

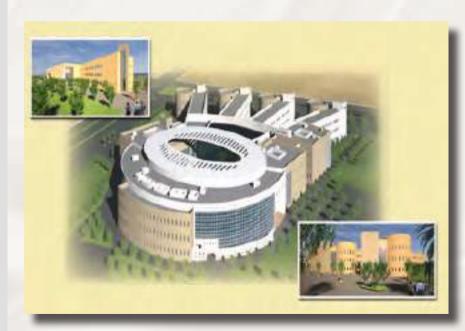



العدد	مكوناته	مساحته	الطابق
٣٣	قاعات دراسية مختلفة السعة (صغيرة-متوسطة -كبيرة)		
١	مطبغ		
١	قاعة طعام	V.1.6V1	÷.51
1	قاعة العاب	۱۲۶۰۱م۲	الأرضي
١	غرف خدمية		
٥١	مكاتب المحاضرين والمكاتب الإدارية واستراحة لأعضاء هيئة التدريس		
١	قاعة دراسية سعة (٦٠) طالبة		
71	معامل بحوث وتدريب		
17	غرف تحضير وتجهيز التجارب		
٣	وحدات تخزين مواد كيميائية (مبردة- جامدة)		
۲	قاعات الاجتماعات	۲۵۷۶۸۱	الاول
١	كافتيريا		
١	المستودعات		
١	محل بيع مستلزمات الطالبات		
٥١	مكاتب المحاضرين والمكاتب الإدارية.		



العدد	مكوناته	مساحته	الطابق
١٨	معامل بحوث وتدريب		
١	مرسم التربية الفنية		
4	صالة متعدة الأغراض	W 1141	-1441
١	المستودعات	۸۱۱۸م۲	الثاني
1	محل بيع مستلزمات الطالبات		
01	مكاتب المحاضرين والمكاتب الإدارية (رؤساء الأقسام - السكرتارية)		



Y / Y / 1

الشارع الإنشائية تحت التنفيذ

إسكان هيئة التدريس وإسكان الطلاب (المرحلة الثانية)

موقع المشروع: المدينة الجامعية بالخرج

نَارِيخُ بِدَايِةُ العَمَلُ : ١/ ١٢ / ٢٩هـ ٢٠٠٨ / ١١ / ٢٩ م

نَارِيخُ نَهَايِهُ العمل : ١٠/١٠ / ١٤٣٤هـ ٢٠١٣ / ٢٠١٣م

النكلفة الإجمالية: ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠

ينكون المشروع من:

١ / إسكان أعضاء هيئة التدريس:

يتكون من فئتين :

- فئة (أ): تتكون من عدد (٤) مبان يتكون كل مبنى من أربعة أدوار وكل دور يتكون من وحدة بمساحة (٨٠٥م٢) وعليه فإن عدد الوحدات للفئة (أ) بالمرحلة الثانية هو (١٦) وحدة .
- فئة (ب): تتكون من عدد (٣) مباني إضافة لما تم انجازه من مباني في المرحلة الأولى كل مبنى يتكون من أربعة أدوار ، كل دور يتكون من وحدتين مساحة كل وحدة (٢٤) وعليه فإن عدد الوحدات للفئة (ب) بالمرحلة الثانية هو (٢٤) وحده.






Y / Y / 1

الشاريع الإنشائية تحت التنفيذ

إسكان هيئة التدريس وإسكان الطلاب (المرحلة الثانية)

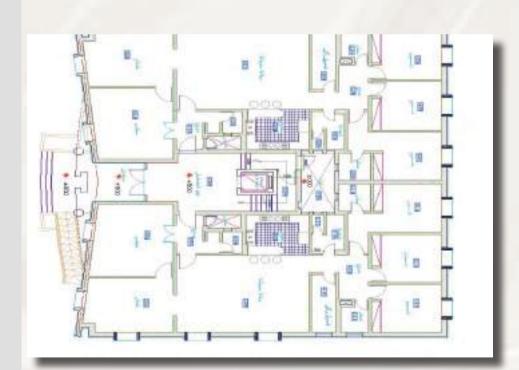

٢ / إسكان الطلاب:

يتكون من عدد (٣) مبان يتكون كل مبنى من ثلاثة أدوار وكل مبنى يحتوي على عدد (١١٠) وحدة سكنية ، مساحة الوحدة الواحدة (٣٠م٢) تقريباً وتسع الوحدة عدد (٣)طلاب وبالتالي تكون سعة إسكان الطلاب بالمرحلة الثانية حوالي (٩٩٠) طالب تقريباً.



*/ */ 1

الشريع الإنشائية تحت التنفيذ

المباني المساندة

موقع المشروع: المدينة الجامعية بمحافظة الخرج

نَارِيحُ بِدَايِهُ العَمِلُ الْمُنُوفَى : ١٠١١/٠٥/١٤ عدم ١٠١١٠ م

ناريخ نهاية العمل المنوقع: ١٠١٤/٥٤١هـ ١٤/١٤ م

النكلفة الإجمالية المنوقعه : ٢٦,٩٤٢,٢٠٣ مليون ريال

ينكون المشروع من :

• مباني الخدمات المساندة وهي أربعة مبان على النحو التالي: -

أولا: (مبنى المطعم)

يتكون من دورين مساحة الدور تقريباً ٢٨٦٧ م٢ ويتكون من صالة طعام رئيسة ومناطق للخدمات الذاتية ومطبخ ودورات مياه وصالات طعام خاصة.





*/ */ 1

الشاريع الإنشائية تحت التنفيذ

المباني المساندة





ثانياً: (مبنى السوق التجاري)

ويتكون من دور واحد مساحته ٢٢١٦ م٢ وهو عبارة عن محلات تجارية ومخزن وكافتيريا ومينى ماركت.

ثالثاً: (مبنى المسجد)

ويتكون من دور واحد مساحته تقريباً ٤٨٢٠ م٢ ويتكون من منطقة المصلى الرئيسي ومنطقة مصلى الصلوات الخمس ودورات مياه ويتسع لحوالي ٤٠٠٠ مصلى تقريباً.

رابعاً: (مبنى صالة الألعاب)

ويتكون من دور واحد مساحته ٢٤٤٥ م٢ تقريباً ويتكون من قاعة ألعاب الدفاع عن النفس ومسبح وكافتيريا وصالات إسكواش وصالة جيمانيزيوم وغرف خدمات مساندة.



\$ / **Y** / **N**

الشاريع الإنشائية تحت التنفيذ

الموقع العام وكلية العلوم والآداب

موقع المشروع: محافظة وادي الدواسر

نَارِيخَ بِدَايِهُ العمل : ١٢/ ١٢/ ١٤ ١٤ ١٤ ٢٠/ ١٢ ٢٠٠٩م

نَارِيحُ نَهَايِهُ الْعَمِلُ الْمُنُوفِي : ۲۰۱۳/۰۷/۲۸ هـ ۱٤ ۳٤/۰۹/۲۰ م

النكلفة الإجمالية: ١٦٤,٣٧٦,٦٦٠ مليون ريال

ينكون المشروع من:

• الموقع العام والاسوار:

مساحة الموقع العام ١٠٠٠,٠٠٠ م٢ يحيط بالموقع سور بكامل حدود الموقع بطول حوالي ٤ كم يوجد ثلاث بوابات للمشروع بوابتين في الواجهة الشمالية وبوابة في الواجهة الجنوبية والطرق الرئيسة والفرعية في محيط مبنى الكلية.





الشاريع الإنشائية تحت التنفيذ

الموقع العام وكلية العلوم والآداب



مبنى كلية العلوم والآداب:

عبارة عن مبنى خرساني يتكون من ثلاثة أدوار وعدد أجزاء الكلية (٨) والمساحة التقريبية لبنى الكلية ٤٣٠٨١ م٢.



0/4/1

الشريع الإنشائية تحت التنفيذ

الموقع العام والبنية التحتية المرحلة الثانية

موقع المشروع: المدينة الجامعية بمحافظة الخرج

نَارِيخَ بِدَايِهُ الْعَمِلُ الْمُنُوفِي : ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٩هـ ٢٠٠٠ م

نَارِينَ نَهَايِهُ العَمَلُ اطْنُوفَعَ : ١١/ ٢ / ١٤ ١٤هـ ٢٠ / ٢٠ / ٢٠م

النكلفة الإجمالية: ١٨٩,٧٠٥,٥٨٦ مليون ريال

ينكون المشروع من:

• ينقسم المشروع الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ ٢٦١٠,٠٠٠م٢ إلى جزئيين رئيسين هما:

أولا: خدمات البنية التحتية وأعمال الموقع العام للمنطقة الشمالية وتشتمل على:-

أ- الأعمال الانشائية والمعمارية وتحتوي على:-

١- الموقع العام.

٢- غرفة الحارس.

٣- غرفة الغاز.

٤- أعمال خزان التحليل (بيارة).

٥- مباني محطة التكيف.






٥/٢/١

الشاريع الإنشائية تحت التنفيذ

الموقع العام والبنية التحتية المرحلة الثانية



٧- غرفة معدات محطة تحلية المياه.

٨- خزان محطة التحلية .

ب- الأعمال الميكانيكية.

ج- الأعمال الكهربائية.

ثانيا: خدمات البنية التحتية وأعمال الموقع العام للمنطقة الجنوبية ويشتمل على:-

أ-الأعمال الإنشائية والمعمارية وتحتوي على: -

١- مبنى خدمات نظام التكييف.

٢- منى الصيانة.

٣- مبنى محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

٤- أعمال مبنى غرفة الغاز.

ه- أعمال مبنى خزانات المياه.

٦- أعمال المداخل الرئيسية.

٧- أعمال الطرق ومواقف السيارات.

ب- الأعمال الميكانيكية.

ج- الأعمال الكهربائية.





7/1/

الشريع الإنشائية تحت التنفيذ

الموقع العام والبنية التحتية المرحلة الثالثة

موقع المشروع: المدينة الجامعية بمحافظة الخرج

ناريخ براية العمل المنوقع: ١٤٣١/١٢/٢١ هـ ٢٠١٠/١١/٢٧

نَارِيحُ نَهَايِهُ العمل المنْوقِي : ١٠١٥/٠٣١٤هـ ٢٠١٣/ ٢٠١٣م

النكلفة الإجمالية: ٥١٢,٧١١,٨١٥ مليون ريال

ينكون المشروع من:

- خدمات البنية التحتية وأعمال الموقع العام بمساحة ٢٥٠,٠٠٠م٢ وتشتمل على:-
 - أ- الأعمال الإنشائية والمعمارية وتحتوي على:-
 - ١- الموقع العام.
 - ۲- أعمال الطرق ومواقف السيارات.
 - ٣- أعمال الأسفلت.
 - اعمال الآبار الارتوازية.
 - أعمال الانترلوك.





7/1/1

الشاريع الإنشائية تحت التنفيذ

الموقع العام والبنية التحتية المرحلة الثالثة



- ٦- محطات الرفع.
- ٧- تنفيذ مبنى الجهد الكهربائي المتوسط.
 - أعمال التكسيات للبوابة الجنوبية.
 - ٩- أعمال أعمدة الخيام المربعة.
- ١٠ أعمال شبكات الري كاملة بالمنطقة الجنوبية.
 - ١١- تنفيذ الزراعة بالمنطقة الجنوبية.
 - ب الأعمال الميكانيكية.
 - ج الأعمال الكهربائية.







الشّاريع الإنشائية المستقبلية

الموقع	التكلفة المتوقعة	اسم المشروع	۴
الخرج	17.,	إنشاء كلية هندسة وعلوم الحاسب (بنات)	1
الخرج	14.,	إنشاء كلية إدارة الأعمال (بنات)	٢
الخرج	14.,	إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية (بنات)	٣
الخرج	14.,	إنشاء كلية التربية (بنات)	٤
محافظة وادي الدواسر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سكن لأعضاء هيئة التدريس	۵
الخرج	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	إنشاء السنة التحضيرية	1
الخرج	7.,,	إنشاء قاعة المحاضرات	٧
الخرج	11.,,	إنشاء معامل وقاعات دراسية	٨
المحافظات	10,,	تسوير أراضي الجامعة بالمحافظات	٩



المشاريع الإنشانية المستتبلية

الموقع	التكلفة المتوقعة	اسم المشروع	م
الخرج	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	إنشاء مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر	1 -
محافظة الأفلاج	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	توصيل الكهرباء لمجمع الأفلاج مع إنشاء محطة كهرباء بالمجمع	11
محافظة حوطة بني تميم	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	توصيل الكهرباء لمجمع حوطة بني تميم مع إنشاء محطة كهرباء بالمجمع	١٢
الخرج	100,000,000	تصميم وإنشاء كلية الطب مع الإشراف - بنين	۱۳
الخرج	1,,	تصميم وإنشاء كلية التربية مع الإشراف - بنين	1 £
الخرج	17.,,	كلية طب الأسنان - بنين	10
الخرج	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	كلية الصيدلة	17
حوطة بني تميم	1,,	الموقع العام والبنية التحتية بمجمع الكليات بالحوطة - بنات	1٧
حوطة بني تميم	* ٣٨٤, •• ٣, •••	تصميم ، إنشاء كلية التربية بحوطة بني تميم مع الإشراف	۱۸

^{*} هذه التكلفة تشمل إنشاء وتصميم كليتي التربية للبنات في الدلم وحوطة بني تميم وكذلك كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج.



الموقع	التكلفة المتوقعة	اسم المشروع	م
حوطة بني تميم	4.,,	كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم - بنين	19
السليل	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل - بنين	۲۰
الخرج	۲٥,٠٠٠,٠٠٠	إنشاء وتجهيز المطاعم	٢١
الخرج	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	منشاءات رياضية	۲۲
الخرج	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	إنشاء المستودعات المركزية	۲۳
الخرج	45,	مباني إدارية مساندة (المرحلة الثانية)	٢٤

الباب الثاني

مشاریع مُنجَزة
مشاریع تحت التنفید
مشاریع مستقبلیة




المشاريع التقنية:

تعتبر المشاريع التقنية الركيزة الأساسية في تطور القطاع التعليمي لذا عمدت الجامعة على استخدام التقنيات والتجهيزات الحديثة في جميع الإجراءات الإدارية والأكاديمية وذلك بالبدء باستخدام العديد من الأنظمة الأكاديمية مثل البوابة الإلكترونية، والإدارية منها مثل النظام المالي والإداري والاتصالات الإدارية، وقد وضعت عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد إحدى العمادات المساندة لوكالة الجامعة المسؤولة عن تحويل مجتمع المجامعة إلى مجتمع إلكتروني عدداً من المراحل على مدار الثلاث سنوات الماضية لتطبيق هذه الأنظمة على جميع وحدات وإدارات الجامعة وقد تحقق بنهاية العام المالي 1878/1877هـ استخدام هذه الأنظمة استخداماً كلياً في جميع الإجراءات الإدارية والفنية والأكاديمية وجاءت المشاريع التقنية على النحو التالى:

التكلفة (ريال)	عدد المشاريع	نوعية المشاريع
746,774,814,61	٨	المشاريع المنجزة
1.,197,781	١	مشاريع تحت التنفيذ
04,0,	٧	مشاريع مستقبلية
٧٠٣,٠٦٠,٠٥٣,٧٦	١٦	الإجمالــــي



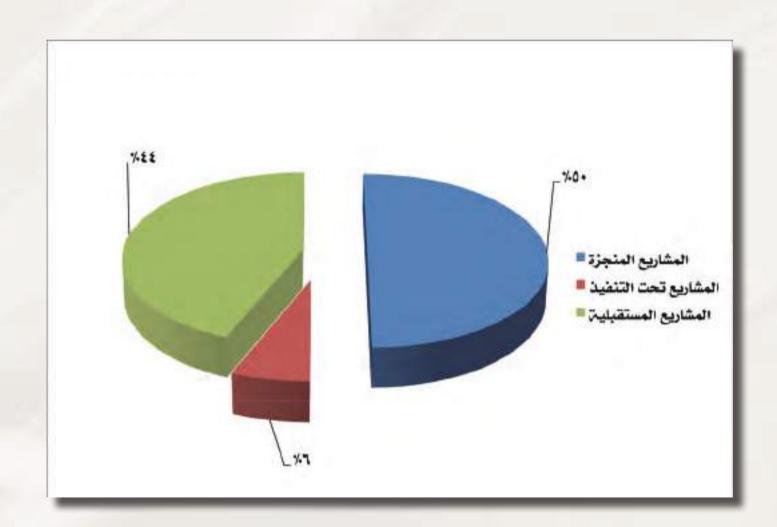



جامعة سلمان بن عبد العزيز Salman bin Abdulaziz University

عور مير حمل لين غيد

in just a state of the

Listby is clicked by



الفصل الأول مشاريع التقنية المنجرة



١/١/٢

نظام الاتصالات الادارية

موقع المشروع: المدينة الجامعية

ناریخ برایهٔ العمل : ۱۱/۵۰/۱۳ میری ۱۱/۵۰/۱۳ ناریخ برایهٔ العمل ا

ناريخ نهاية العمل: ١١/ ١٠/ ١٤٣٤هـ ١٤٣٠ /١٠١٠م

النكلفة الإجمالية المنوقعه : ١٠٠,٠٠٠ ريان

ينكون المشروع من:

نظام لمتابعة جميع المعاملات الواردة و الصادرة، و ما يتعلق بهذه المعاملات من بيانات و وثائق، كما يقوم النظام بإدارة الدورة الحياتية لهذه المعاملات من لحظة إدخال المعاملة و الوثائق الواردة إلى لحظة تصديرها. كما أن النظام يعتمد على بيئة الويب و تم تطويرها وفق أحدث المعايير العالمية.


• تحسين متابعة دورة حياة المعاملات الواردة و الصادرة في الجامعة.





الشريع التقنية النجزة

نظام الاتصالات الادارية



- تحسين الوصول إلى المستندات المتعلقة بالمعاملات لتوفير الجهد و الوقت.
- المحافظة على الوثائق القيمة من الضياع و التلف.
- تحسين فعالية أمن الوثائق و السجلات و سريتها.



Y / 1 / Y

الشاريع التقنية النجزة

الأنظمة الإدارية و المالية و الأكاديمية

موقع المشروع: المدينة الجامعية

نَارِيخُ بِدَايِةُ العمل : ١٠١٧/٠ ١٤٣٤هـ ١٠/١٢ م

نَارِيحُ نَهَايِةُ العمل: ١٤/ ٢٠/ ١٤٣٣هـ ١٦ / ١٠٠٠ م

النكلفة الإجمالية المنوقعه : ١٣،٠٩٧،٧١٥ ريال

ينكون المشروع من:

من برامج تهدف إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتحسين دورة الأداء والجودة لدورات العمل الداخلية وتوفير التقارير اللازمة لاتخاذ القرار وتوفير بنية تحتية متكاملة من البرامج والعتاد لإدارة الأنظمة المالية والإدارية والأكاديمية في الجامعة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية والوصل إلى مستوى الجامعة الإلكترونية منافسة لأرقى الجامعات العالمية في الخدمات الإلكترونية المقدمة ويتكون المشروع من:





Y / 1 / Y

الشاريع التقنية المنجزة

الأنظمة الإدارية و المالية و الأكاديمية



- نظام إدارة شؤون الطلاب
 - نظام الشؤون المالية
- نظام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
 - نظام المشتريات والمستودعات والمخزون
 - نظام الصيانة
 - خوادم قواعد البيانات
 - خوادم التطبيقات والخدمات الإلكترونية
 - أجهزة تخزين البيانات
 - نظام القبول والتسجيل



4/1/4

الشاريع التقنية النجزة

الربط الشبكي وتحسين الشبكات المحلية لفروع الجامعة

موقع المشروع: فروع الجامعة في جميع المحافظات

ناریخ بدایه العمل: ۲۰۱۱ / ۸ / ۲۳ مایه العمل

ناریخ نهایه العمل: ۱۲/۲۱/ ۱۲۲۸ه ۱۴۳۲ ۲۰۱۱/۱۸

النكلفة الإجمالية : ٣,٠٦٠,٤٩١ ريال

يهدف المشروع إلى ربط فروع الجامعة في المحافظات بشبكة الجامعة في المقر الرئيسي حيث ينم:

- ربط الفروع بنظام إدارة شؤون الطلاب (النظام الأكاديمي).
- ترقية عدد من أجهزة الموجهات (سوتشات) المتوفرة حالياً في فروع الجامعة إلى نظام تشغيل قادر على توجيه الصوت والصورة والتعامل مع بروتوكولاتها.
 - توريد أجهزة موجهات (سوتشات) جديدة في جميع من فروع الجامعة في المحافظات.
- تشغيل الخدمة الهاتفية في الفروع من خلال بروتوكول الإنترنت (IP-Telephony) بعد ربطها بمدير الاتصال (Manager) في المقر الرئيس.
 - توريد أجهزة هاتفية تعمل على بروتوكول الإنترنت.



" / 1 / T

الشاريع التمنية النجزة

الربط الشبكي وتحسين الشبكات المحلية لفروع الجامعة



- توريد وتنفيذ شبكة داخلية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية (بنات) بالخرج
- توريد وتنفيذ شبكة داخلية في كلية التربية (بنات) بالخرج
- توريد وتنفيذ شبكة داخلية في كلية التربية (بنات) بالدلم
- تورید وتنفید شبکة داخلیة فی کلیة التربیة (بنات) بحوطة بنی تمیم
 - التدريب والدعم الفنى والصيانة

وسيتم تناول جميع المكونات السابقة بالتفصيل في وثيقة المواصفات فيما بعد كلا على حده. كما توفر معلومات حول عملية إعداد العروض.



\$ / 1 / Y

الشاريع التقنية النجزة

الاتصالات المرئية لقاعات الاجتماعات



نَارِيخُ بِدَايِهُ العمل: ١١/١١ / ٢٠١١م ٢٠١١ م

نَارِيخُ نَهَايِهُ العمل : ١١/١١/١١هـ ١٤٣٣هـ ١٠١١/١١/١١م

النكلفة الإجمالية: ١,٢٥٠,٨٠٠ ريال.

ينكون المشروع من:

- تجهيز ١٦ قاعة اجتماع للجامعة بأجهزة الاتصال المرئي من نوع Polycom ودرجة وضوح عالى الدقة.
 - تزويد الجامعة بجهاز الاتصال الجماعي RMX .
 - تركيب سماعات سقفيه.
 - تركيب نظام نقاش وإدارة الميكروفونات في قاعات الاجتماع .







0/1/7

الشاريع التقنية المنجزة

تجديد رخص برامج وتطبيقات مايكروسوفت لأجهزة وسيرفرات الحاسب الآلي بالجامعة

موقع المشروع: جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج

ناريخ براية العمل: ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣هـ ٢٠١٢ / ٢٠١٢م

ناريخ نهاية العمل : ١٠ / ١٩/ ٢٠١٨ هـ ٢٠١٢م

النكلفة الإجمالية : ١,٨٨٨,٠٤٨,٧٦ ريال



ينكون اطشروع من:

- توفير برامج وتطبيقات مايكروسوفت لأجهزة وسيرفرات الحاسب الآلي بالجامعة.
 - ۱- نظام النوافذ للتشغيل (Windows).
 - ٢- برنامج البريد الإلكتروني.
 - ٣- برنامج فيجوال استربو للبرمجة.
 - ا نظام التشغيل للخوادم (Windows Server)
 - ٥- نظام فزيو للتصاميم
 - ٦- برامج وتطبيقات ميكروسوف أوفسيت.



7/1/7

الشاريع التقنية المنجزة

Data Center


إنشاء مركز المعلومات

موقع المشروع: جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج

نَارِيخُ بِدَايِهُ العمل : ٢٠١١/٨/٦ م

نَارِيحُ نَهَايِهُ العمل : ١/٣٠هـ ١٤٣٣هـ ٢٠١١/١١/٣٠

النكلفة الإجمالية : ٨٥٣,٢٦,٣٥٨ ريال



- تصميم مركز معلومات الجامعة وفق المعايير الفنية التي تناسب الوضع الحالي
 للجامعة وفروعها ونموها المستقبلي.
- تورید وترکیب أجهزة ربط الشبكات من موزعات وموجهات وموازنات وغیرها.
 - توريد وتركيب أنظمة أمن وحماية الشبكات والأنظمة.
 - تورید وترکیب الخوادم وکذلك أجهزة وأنظمة تخزین البیانات وملحقاتها .
 - التوظيف التدريب.
 - الدعم الفنى والصيانة.





المشاريع التقنية النجزة

تشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي والشبكات بالجامعة

موقع المشروع: جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج

ناریخ بدایهٔ العمل : ۱۱/۲/۱۷ هـ ۲۰۱۲/۲۸م ۲۰۱۲م

نَارِيخُ نَهَايِهُ العمل : ٩ / ٢٠١٣/٧/١٧ هاية العمل :

النكلفة الإجمالية المنوقعه : ١٩٤٥٠،٠٠٠ ديال

Service of the servic

ينكون المشروع من:

- تأسيس قسم الدعم الفني بعمادة تقنية المعلومات
 - تشغيل وصيانة البوابة الإلكترونية للجامعة
 - تدريب الكوادر البشرية
- توفير ٢٢ موظفاً من مهندسين ومصممين وفنيين



A / 1 / Y

الشاريع التقنية النجزة

القاعات النموذجية المطورة _ المرحلة الأولى

व्हां । विकार جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج

ناريخ بداية العمل: ١١ /١١ / ١٤٣٣هـ ٢٠ / ١٠ / ٢٩ م

٩٢ / ١٢ / ٣٣٤١هـ ١٤ / ١١ / ٢١٠٢م

النكلفة الإجمالية المنوقعه : ٤,٤٩٠,٠٠٠

ناريخ نهاية العمل:

يشمل المشروع النجهيز الصوني والرئي والانصال عن بعد لعدد [2] قاعات باطرينة الجامعية.

١- تجهيز قاعة مجلس الجامعة تجهيزا كاملاً بكافة الاحتياجات من الأثاث وأنظمة الصوت والصورة والتحكم والاتصال المرئى وأعمال الديكور الداخلي والإضاءة وما يتطلب ذلك من أعمال كهربائية وميدانية داخل





A / 1 / Y

الشريع التمنية النجزة

القاعات النموذجية المطورة _ المرحلة الأولى



المكان المعتمد لقاعة مجلس الجامعة

- ٢-قاعة تدريب كبار الشخصيات (مقسمة على قسمين)
 بالمدينة الجامعية.
 - ٣- قاعة مجلس الجامعة النسائي بمبنى الهداية .
 - ٤- قاعة تدريب كبار الشخصيات (نساء) مبنى الهداية.
- ٥- التشغيل ويشتمل على عدد (٢) مستعملي أجهزة تعليمية



جامعة سلمان بن عبد العزيز Salman bin Abdulaziz University





جامعة سلمان بن عبد العزيز Salman bin Abdulaziz University



1/4/4

مشريع تقنية تحت التنفيذ

تشغيل بوابة التعلم الإلكتروني

موقع المشروع: جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج

نَارِيخُ بِدَايِةُ العمل : ١١ / ١١ / ١١هـ ٢٠١٢ / ٢٠١٢م

نَارِيخُ نَهَايِهُ الْعَمَلُ : ١٩ / ٣/ ١٤هـ ١٤ / ٢٠ ٢٠ م

النكلفة الإجمالية المنوقعه : ١٠,٨٩٦,٦٤١ ريال

ينكون المشروع من:


- و تمكين الجامعة من تقديم خدمات التعلم الإلكتروني من خلال بنية تقنية وفنية متكاملة.
- التأكيد على استخدام نظم الاختبارات الإلكترونية لتقويم الطلاب إلكترونيا بسهولة ودقة عالية.
- توفير التوعية والتدريب والتطوير وبناء القدرات لتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس في استخدام هذه المنظومة.
- رفع الوعي لدى المجتمع حول مفهوم التعلم الإلكتروني والحاجة إلى استخدامه لتحسين مستوى التعليم بالجامعة.





جامعة سلمان بن عبد العزيز Salman bin Abdulaziz University



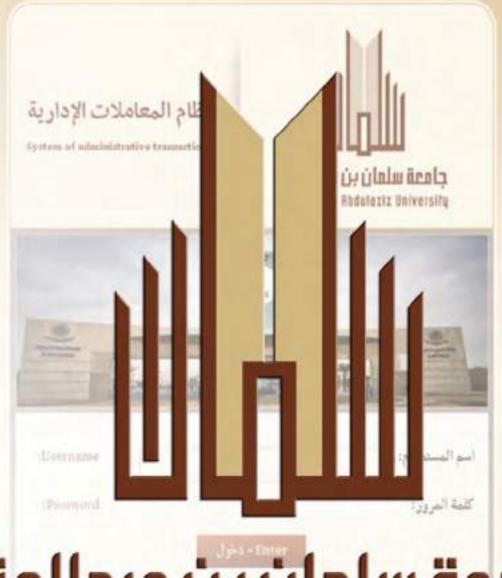

جامعة سلمان بن عبد العزيز Salman bin Abdulaziz University





النكلفة المتوقعة	اسم المشروع	م
18,,	الخدمات الإلكترونية (المرحلة الأولى)	1
٣,٥٠٠,٠٠٠	مكتب إدارة المشاريع PMD	٢
0,***,***	مراقبة وحماية شبكة الجامعة	٣
٣,٠٠٠,٠٠٠	الربط التلفزيوني لمسارح الجامعة في المقر الرئيسي والفروع	٤
٩,٠٠٠,٠٠٠	نظام الإعلانات واللوحات الإلكترونية	۵
1.,	تطوير وتحسين الشبكات المحلية السلكية واللاسلكية لفروع الجامعة	1
1.,	نظام الأرشفة الإلكترونية لوثائق ومستندات الجامعة	٧
٥٤,٥٠٠,٠٠٠	الإجمــالـي	










التجهيزات:

سعت الجامعة منذ نشأتها إلى الارتقاء بالمخرجات التعليمية ورفع معيار جودتها لذا عمدت عن طريق إدارة المشتريات إحدى الإدارات المساندة لوكالة الجامعة إلى تأمين وتجهيز المباني الإدارية والأكاديمية على حد سواء بكافة المستلزمات المكتبية والتعليمية الحديثة حيث بلغ إجمالي عدد المنافسات التي طرحتها الجامعة حتى نهاية السنة المالية ١٤٣٤/١٤٣٣هـ (٤٧) منافسة بالإضافة إلى العديد من التعاميد الصادرة عن طريق التأمين المباشر وكذلك التعاميد الصادرة بشأن إعادة تأهيل وترميم كليات الجامعة بشكل عام وكليات المبنات بشكل خاص.



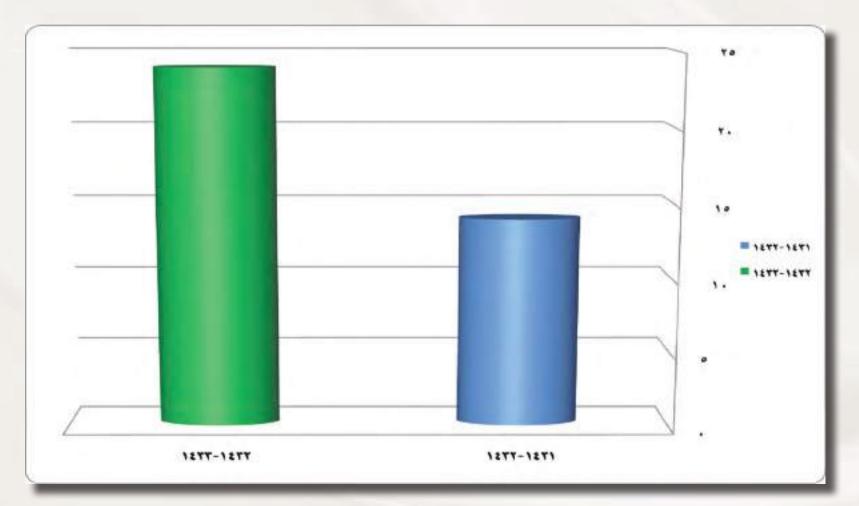

رسم بياني يوضح عدد المنافسات في عامي ١٤٣١ / ١٤٣٢هـ - ١٤٣٢ / ١٤٣٣هـ



منافسات عام (۱۲۳۲هـ)

الجهة المشرفة	المدة	قيمة المترسية	اسم الشركة/المؤسسة	اسم المنافسة	م
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	۹ أشهر	1898.10	الشركة الفنية لتوطين التقنية	توريد وتركيب الأنظمة المالية	1
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	۲٤ شهراً	0.20 * . * * *	شركة المعمر للأنظمة والمعلومات	تشغيل وصيانة الحاسب الآلي	٢
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	۳ سنوات	7,797,777	مؤسسة أضواء الأبرار للمقاولات	تشغيل وصيانة ونظافة كلية الصيدلة وكلية الهندسة مبنى (أ) - (ب) وكلية العلوم الطبية التطبيقية	٣
إدارة المشاريع والصيانة أو الخدمات	۳ سنوات	7.797.778	مؤسسة كواسب للتجارة والمقاولات	تشغيل وصيانة ونظافة مبنى مركز الخدمات الطبية التعليمي والسكن التابع له	٤
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	٤ أشهر	۸،٤٢٦،٣٥٨	مؤسسة دار بيتا لتكنلوجيا المعلومات	إنشاء مركز المعلومات	۵
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	۳ سنوات	7.7 · V.A7 · .99	مؤسسة مواقع النجوم بالتضامن مع شركة سرايا طويق	صيانة وتشغيل كليات البنات بالأفلاج و حوطة بني تميم	1
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	۳ سنوات	0.0**.**	مؤسسة مواقع النجوم بالتضامن شركة سرايا طويق	صيانة وتشغيل كليات البنات بمحافظة الخرج	٧
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	٣ أشهر	٣،٠٦٠،٤٩١	مؤسسة دار بيتا	الربط الشبكي وتحسين الشبكات المحلية	٨



منافسات عام (۱۲۳۲هـ)

الجهة المشرفة	المدة	قيمة الترسية	اسم الشركة/المؤسسة	اسمالنافسة	م
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	شهران	1,700,000	مؤسسة أنماط التقنية	مشروع اتصالات المؤتمرات المرئية لقاعات الاجتماعات	٩
عمادة السنة التحضيرية	سنة أكاديمية	۱۱،۸٦۲،۸۵۰	شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب	تشغيل وإدارة السنة التحضيرية بجامعة الخرج	١٠
إدارة الأمن والسلامة	۳ سنوات	11.04	مؤسسة أحمد سليمان الفهاد	تنفيذ أعمال الحراسة والسلامة بالجامعة	11
إدارة المنقل	٣ سنوات دراسية	77.788.077	مؤسسة النخلة الأهلية للتجارة والمقاولات ومؤسسة ركن التحكم للمقاولات والنقل	نقل طالبات جامعة الخرج	١٢
كلية طب الأسنان	٤ أشهر	9,708,177	شركة القصيبي للتجارة العامة	تجهيز معامل كلية طب الأسنان	۱۳
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	٣أشهر	1,,17.,70.,90	مؤسسة منار الهفوف للتجارة ودار العرب للنشر والتوزيع	تأمين كتب لكليات الجامعة	١٤



(التأمين المباشر) لعام ١٤٣١هـ

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية إدارة الأعمال بالخرج	ه٧ يوماً	799,70.	عدة شركات	١		١
كلية هندسة وعلوم الحاسب	٦ أسابيع	1.1,14.	مؤسسة بيت الرياض	١		۲
كلية التربية بالدلم	شهران	97,	مؤسسة عبدالله الصانع للتجارة	١		٣
كلية المجتمع بالأفلاج	٦ أسابيع	17,780	مؤسسة بيت الرياض	١	تأمين مستلزمات	٤
كلية المجتمع بالخرج	١٤يوماً	۲۵٦,۸۰۰	مؤسسة الدرع الثابت	١	تعليمية	٥
عمادة السنة التحضيرية	-	1,774,700	عدة شركات	٣	(Y/YYY)	٦
كلية الصيدلة	۷ أيام	07017V	عدة شركات	٣		٧
كلية الهندسة وعمادة القبول والتسجيل	أسبوعان	77707.	عدة شركات	٣		٨
كليات الحوطة بنين+بنات	-	1,707,70.	عدة شركات	٦		٩
كليات البنات الأقسام العلمية والأدبية بالخرج وكلية التربية بالدلم	-	07£,	عدة شركات	*		1.



(التأمين المباشر) لعام ١٤٣١هـ

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج وكلية التربية بالحوطة والدلم		710,	عدة شركات	١		11
كلية العلوم والدراسات الإنسانية وكلية المجتمع بالأفلاج	-	٣٨١,٤٨٠	عدة شركات	٣		١٢
كلية التربية للبنات الأقسام الأدبية بالخرج	-	710700	عدة شركات	٣	تأمين مستلزمات	۱۳
كلية التربية للبنات بوادي الدواسر	-	1,202,00	عدة شركات	٨	تعليمية	١٤
كلية التربية بنات الأقسام العلمية	-	۸۳٧,٠٢٠	عدة شركات	٣	(۲/۲۲۲)	10
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	-	1,571, 21.	عدة شركات	٤		١٦
عمادة القبول والتسجيل	-	۸٥٢٩٥٠	عدة شركات	۲		۱۷
إدارة المتابعة	-	144,***	عدة شركات	١		١٨
كلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية الطب	_	٥٠٠,٤٠٠	عدة شركات	4		19



بيان الأثاث المكتبي لعام (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية المجتمع بالأفلاج		٧١,٨٥٠	بيت الرياض	۲		١
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	-	444,4	مؤسسة الحزنوي	١		۲
كليات الحوطة والحريق	-	1,018,177	عدة شركات	٦		٣
كلية التربية للبنات الأقسام العلمية	-	٣٤٢, ١٣٠	مؤسسة عبدالله الصانع	۲		٤
كلية التربية للبنات الأقسام الأدبية	4-11	۸٤٥,۸۸٥	عدة شركات	٥	تأمين	٥
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة		٣٩٥,٥٥٥	عدة شركات	۲	أثاث ومستلزمات	٦
صحيفة الجامعة ومركز المعلومات والحاسب الآلي	أسبوع	٤٩,٩٠٠	مؤسسة الحزنوي التجارية	١	مكتبية	٧
كلية الهندسة	-	£ 7V, 7V9	عدة شركات	۲	(۲۲۱)	٨
كلية المجتمع بالخرج	أسبوع	۳۷۵,۳۰۰	شركة الهوشان المحدودة	١		٩
عمادة القبول والتسجيل	-	٦٠٧,٦٤١	عدة شركات	٥		١٠
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	أسبوع	78,700	مؤسسة عبدالله الصانع للتجارة	١		11
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	ه٤ يوماً	127, • 2 •	شركة الهوشان المحدودة	١		١٢



بيان الأثاث المكتبي لعام (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	م
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	١٤ يوماً	۳۸,۷۷۰	مؤسسة وفال العالمية	١		۱۳
إدارة المشتريات	شهر	٧١,٤٨٥	مؤسسة بيت الرياض	١		1 £
كلية العلوم والدراسات الإنسانية	شهر	۲۸,۹۰۰	مؤسسة وفال العالمية	1	٩	10
كلية الصيدلة وكلية الطب وكلية طب الأسنان		05.,5.0	عدة شركات	٣	تأمين	١٦
كلية إدارة الأعمال	أسبوعان	01,000	مؤسسة بيت الرياض	١	أثاث ومستلزمات	۱۷
كلية الصيدلة	٤ أسابيع	1.7,71.	مؤسسة بيت الرياض	١	مكتبية	١٨
إدارات ووحدات الجامعة		1,020,11	عدة شركات	٨	(۲۲۱)	19
كلية الهندسة وعمادة القبول والتسجيل	أسبوعان	۸٠,٠٠٠	مؤسسة غزاي غنام البدراني الحربي للتجارة	1		۲.
إدارات وحدات الجامعة	أسبوع	۸٠,٠٠٠	مطابع الخالد للأوفست	١		71



بيان الأثاث المكتبي لعام (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية المجتمع بالخرج وكلية التربية للبنات بالحوطة وكلية طب الاسنان وكلية المجتمع بالأفلاج وإدارة الاعمال بالحوطة وكلية الصيدلة	Ä	987,970	عدة شركات	٦	توريد وتركيب مكيفات وثلاجات وأدوات كهربائية	**
عمادة القبول والتسجيل ، كلية المجتمع ، كلية الطب ، كلية إدارة الأعمال بالحوطة		***,***	عدة شركات	٤	تأمين أجهزة سنترال وملحقاته	**
إدارات ووحدات الجامعة	أسبوعان	٥٣,٩٠٠	ريشة الاشراق	١	تأمي <i>ن</i> لوحات	7 £
كلية التربية للبنات الأقسام العلمية ، كلية التربية للبنات بحوطة بني تميم ، إدارات وأقسام الجامعة		770,• 7•	عدة شركات	٤	تأمين احبار الآت التصوير والطابعات والفاكسات	70



تجهيز وتأثيث المعامل والكليات (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	م
كلية التريبة للبنات بالحوطة	شهر	787,900	مؤسسة مسار الشعاع للتجارة	١	معملين للحاسب الآئي	١
كلية التريبة للبنات بالحوطة	شهر	710,	مؤسسة مسار الشعاع للتجارة	١	معمل اللغة الإنجليزية	۲
كلية التريبة للبنات بالحوطة	شهر	707,	مؤسسة عبدالله محمد الصانع	١	معمل الكيمياء	٣
كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر	(۷۰) يوماً	127,10+	مؤسسة ركن البراءة	١	معمل شبكات المتكاملة	٤
كليتي الهندسة والعلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر		٦,٠٠٠	شركةنسجا لأبعاد للاستشارات الهندسية	١	تصمیم عدد (٤) معامل مختبرات طبیة	٥
كليتي الهندسة والعلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر		0,***	شركةنسجا لأبعاد للاستشارات الهندسية	١	تصميم عدد (٣) معامل حاسب آلي	٦
كليتي الهندسة والعلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر		۸,۰۰۰	شركةنسجا لأبعاد للاستشارات الهندسية	١	تصمیم عدد (٤) معامل هندسیة	٧
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بوادي الدواسر والأفلاج لبرنامج السنة التحضيرية	شهر	088,900	مؤسسة مسار الشعاع	١	تركيب معملي حاسب آلي ولغة مدمج بالحاسب الآلي	٨
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	شهر	71m,·mo	مؤسسة دور المباني للتجارة	1	معمل تعليم لغة مدمج بالحاسب الآلي	٩
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	شهر	17.,70.	مؤسسة النظرة الطبية للتجارة	١	تأمين أدوات وتجارب لمعمل الفيزياء	١
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج	شهر	۳۹۸,۹۰۰	مؤسسة مسار الشعاع للتجارة	1	معملين حاسب آلي مع إضافة برنامج تعليم اللغات	١



تجهيز وتأثيث المعامل والكليات (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية المجتمع بالخرج	أسبوعان	٣٩١,٨٠٠	مؤسسة الدرع الثابت	١	معمل لغة إنجليزية	١٢
كلية المجتمع بالخرج	أسبوعان	٣٣٠,٠٠٠	مؤسسة الدرع الثابت	١	معمل حاسب آلي	۱۳
كليتي العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج وحوطة بني تميم	شهر	028,900	مؤسسة مسار الشعاع للتجارة	١	معملي حاسب آلي ولغة مدمج بالحاسب الآلي	١٤
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج	شهر	۸٥,۸۸۰	الشركة السعودية للتسويق والتجارة	١	تأمين بنشات لمعمل الأحياء	10
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج	أسبوع	۱۸۰,۸۰۰	شركة الحربي للمشروعات التعليمية للتجارة	١	تجهيز معمل الفيزياء قسم تقنية الأجهزة الطبية	١٦
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج	أسبوع	727,277	شركة محمدعايض الشدادي للتجارة	١	تجهيز معمل الفيزياء قسم تقنية الأجهزة الطبية	١٧
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج	شهران	٧٩٧,٩١٠	مؤسسة كيان الوفاء للتجارة	١	تجهيز معمل فيزياء اشعاعية	۱۸
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج	أسبوع	T17,0	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	١	تجهيز معمل الدوائر الكهربائية	19
كلية التربية الأدبية للبنات	شهر	٤٥٧,٤٠٠	مؤسسة الحزنوي التجارية	_	توريد وتركيب معمل الصوتيات بقسم اللغة الإنجليزية	۲.
كلية التربية للبنات بالدلم	٣أشهر	YVA,9 • 0	مؤسسة عبدالله محمد الصانع	١	تأمين كيماويات وأجهزة خاصة بالمختبرات	۲۱



تجهيز وتأثيث المعامل والكليات (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	م
كلية التربية بالدلم	شهر	٤٦٨,٧٠٠	مؤسسة مسار الشعاع التجارية	١	تأمين معملين حاسب آئي مع إضافة برنامج تعليم اللغات المدمج	**
كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بالخرج	٣ أشهر	۳۱۰,۸۸۰	مؤسسة دار اللوازم العلمية والمدرسية	١	تأمين أجهزة وأدوات خاصة بالمختبرات	74
كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بالخرج	٣ أشهر	٣ ٣٨, • ٨ •	مؤسسة دار اللوازم العلمية والمدرسية	1	تأمين بعض الأجهزة والأدوات الخاصة بمختبرات الفيزياء	7 £
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج		17.70.	مؤسسة النظرة الطبية	١	تأمين أدوات وتجارب لمعمل الفيزياء	70



أدوية ومعدات ومستلزمات طبية (بند ٢٢٣) لعام (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية طب الأسنان		٤,١٤٠,١٧٠	مؤسسة خالد منصور العمير ومؤسسة الأسنان الحديثة	٦	تأمين عيادات ومعامل وأجهزة وأدوات طبية	١
كلية الصيدلة		7,077,	عدة شركات	٥	تأمين مواد كيماوية وزجاجات ومعدات وملابس طبية	۲
كلية الطب		1,•77,771	عدة شركات	٦	تأمين أجهزة وشرائح وعينات طبية	٣
كلية العلوم الطبية التطبيقية		799,070	مؤسسة الخبر العلمي للمعدات الطبية	١	تجهيز وحدة العلاج الطبيعي	٤
كلية العلوم الطبية التطبيقية		۳,۳٦٥,٠٠٠	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة ومؤسسة صالح الفالح التجارية	٤	تأمين أجهزة طبية	0
كلية العلوم الطبية التطبيقية		977,777	عدة شركات	٥	تأمين دمى تشريحية وكتب للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي وبالطو	٦



محروقات وصيانة وسائط النقل والمعدات (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
إدارات وكليات الجامعة		٤١٠,٣٠٥	عدة شركات	٣	صيانة آلات التصوير	١
إدارة الحركة		۲۱٦,٦۲۲	قمة الرشد	۲	صييانة السيارات وتأمين قطع السيارات	۲
إدارة الحركة		750,700	مؤسسة أبراج الخرج للتجارة	4	تأمين بطاريات وإطارات	٣



تأمين معدات وسيارات (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية
إدارة الخدمات		72.,	عبداللطيف العيسى	١	تأمي <i>ن س</i> يارات إيسوزوا
إدارة الخدمات		110,0**	شركة الوعلان للسيارات	١	تأمين سيارات هيونداي اكسنت عدد (٣)
إدارة الأمن والسلامة		Y70,···	شركة الوعلان للسيارات	١	تأمين سيارات هيونداي توسان أمنية (ه)
إدارة الخدمات		088,***	شركة الحمراني للتجارة والاستيراد	١	تأمين ٣ حافلات سفليان (٣٠) راكب موديل ٢٠١٠
إدارة الخدمات		٧١٢,٠٠٠	شركة الحمراني للتجارة والاستيراد	4	تأمین عدد (۲) نیسان سفلیان GFR راکب ۲۰۱۰
إدارة الخدمات		188,***	شركة الحمراني للتجارة والاستيراد	١	تأمين ٣ نيسان صني بي أي ٢٠١٠ اتوماتيك
إدارة الخدمات		104,	شركة الحمراني للتجارة والاستيراد	١	تأمین عدد ۲ نیسان اکس تریل مودیل ۲۰۱۰
إدارة الخدمات		177,	شركة الفلاح للسيارات	١	تأمين عدد ٣ هايلكس غمارة (بنزين)
إدارة الخدمات		177,700	شركة الجميح للسيارات	١	تأمين سيارة شفروليه صالون سوبر مان ٢٠١٠
إدارة المستودعات		1117+	شركة عمر قاسم العيسائي	١	تأمين رافعة شوكية ١,٥ كهربائية طن ٢٠١٠
إدارة المستودعات		1	شركة عمر قاسم العيسائي		تأمين رافعة شوكية ٣طن جازولين ٢٠١٠



تأمين معدات وسيارات (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
إدارات ووحدات الجامعة		٤١٨,٠٠٠	شركة الموسى والرشيد للسيارات	١	تأمين سيارات هايلوكس غمارتين وغمارة ٢٠١٠	١٢
إدارات ووحدات الجامعة		٣٦٦,٠٠٠	شركة الموسى والرشيد للسيارات	٣	تأمين عدد ٤فورتشنر اتوماتيك ٢٠١١	۱۳



خدمات الحاسب الآلي والشبكات لعام (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية المجتمع	أسبوع	17,	شركة القلعة الدولية	١	ربط كلية المجتمع بالخرج بشبكة الجامعة	١
شؤون الموظفين	أسبوعان	0.,	مؤسسة رويفد الصاعدي	١	تطوير موقع استقبال المتقدمين للوظائف	۲
تحت إشراف وكالة الجامعة	۹۰ يوماً	177,	ذرا التقنية	١	إنشاء البوابة الإلكترونية للجامعة (المرحلة الأولى)	٣
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	أسبوع	72,970	مؤسسة أوجس العالمية للإتصالات	١	توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الدخول والخروج	٤
إدارة الجامعة	٤ أشهر	۸٠,٠٠٠	الشركة العربية لخدمات الأنترنت والإتصالات	١	تأمين وإدخال الشبكة العنكبوتية	٥



ترميمات وإضافات لعام (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية طب الأسنان	۲۰ يوماً	۲۳,۱۰۰	مؤسسة عبدالله سعد الفوزان	1	توريد وتركيب مظلات لسيارات	١
إدارة الأعمال بحوطة بني تميم	شهر	٧٩,٥٠٠	شركة القرش للمقاولات	١	تأمين مظلات معدنية وقواطع الجبس وأبواب المنيوم	۲
إدارة الأعمال بحوطة بني تميم	۲۰ يوماً	٣٩,٠٥٠	شركة القرش للمقاولات	١	تورید وترکیب مظلات معدنیة وزجاج عاکس وترکیب وحدة إنارة فلوریسنت	٣
كلية طب الأسنان	شهران	٦٠,٠٠٠	مؤسسة عبدالعزيز محمد السعيس	١	إنشاء مستودع خارجي	٤
كلية التربية للبنات الأقسام الأدبية	-	٥٨,٢٥٠	عدة شركات	4	إنشاء مصلى وترميم معمل وإنشاء معامل	٥
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج	أسبوع	٣٤,٠٠٠	شركة المقبل للمقاولات	١	دهان السور الخارجي مع الأبواب	٦



تأمين خدمات الأمن والسلامة لعام (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
إدارة الخدامات (الأمن والسلامة)	۲۰ یوم	۸۵٦,۱۲٤	مؤسسة الحلول الأمنية	٣	تأمين معدات ولوازم أمنية	١
كلية الهندسة وإدارة الجامعة	٤٠ يوم	1,.99,1	مصدر الإبداع للتجارة	۲	تركيب كمرات مراقبة أمنية	۲
(٤) سيارات ثلاً من	أسبوع	17,***	المؤسسة العامة للتجهيزات الأمنية	١	تركيب جهاز إنذار ضوئي وصوتي مع الونان	٣
إدارة الأمن والسلامة	أسبوع	198,800	شركة الإتصالات العامة	١	تأمين أجهزة لاسلكية برافو	٤
كلية التربية للبنات بوادي الدواسر	ه٤ يوماً	٤٤,٣١٠	مؤسسة بناء وشبكات للتجارة	1	تأمين أجهزة الأمن والسلامة	٥
معامل ومستودعات كلية التربية بالدلم	شهر	77,777	مؤسسة بناء وشبكات للتجارة	١	تأمين أدوات ومستلزمات الأمن والسلامة	٦



كساوي وتجهيزات لعام (١٤٣١هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	۴
إدارة الأمن والسلامة	شهر	07,70.	مؤسسة الفيلق الثابت للتجارة	1	تفصيل بدل لرجال الأمن	١
كلية الصيدلة والعاملين بالمستشفى الجامعي	أسبوع	75970.	النظرة الطبية	١	تأمين ملابس وبالطوهات	۲



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
بعض كليات وإدارات ووكالات الجامعة	٥٠ يوماً	7, 5. 7, 71.	عدة شركات	14		١
معاثي المدير ووكلاء الجامعة	شهر	٤١٥,١٢٥	عدة شركات	٤		۲
كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم	أسبوع	1.1,.0.	مؤسسة ربوع الإبداع للتجارة	1	تأمين	٣
إدارة العلاقات العامة ، صحيفة الجامعة ، قاعة التشريفات	ه٤ يوماً	712,770	عدة شركات	۲	نامی <i>ن</i> أثاث	٤
عمادة تقنية المعلومات، وقاعة الاجتماعات بمبنى الجامعة	٥١يوماً	177,70.	عدة شركات	۲	اتات ومستلزمات	٥
كلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التربية بالخرج (للطالبات	٤٠ يوماً	1,118,000	عدة شركات	٤		٦
شؤون أعضاء هيئة التدريس قسم النساء والرجال	٥٢يوماً	٥٨٧,٧٤٥	عدة شركات	۲	مكتبية	٧
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	أسبوعان	19.,	مؤسسة النظم السعودية للأعمال التجارية	١		٨
كلية طب الأسنان بالخرج	شهر	194,44	مؤسسة بيت الرياض الجريسي	1		٩
كليةالطب	أسبوع	17,77	مؤسسة صفوة الخرج لصناعة الأثاث	١		1.
إدارات الجامعة والعمادات المساندة	٥١يوماً	78,700	شاشات القمم	1	تأمين شاشات إلكترونية لعرض العبارات التوجيهية	11



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
عمادة القبول والتسجيل	اسبوع	*** , 99 *	مؤسسة بيت الرياض الجريسي	4	تأمين آلات طباعة البطاقات	١٢
كلية الصيدلة ، كلية العلوم والدراسات الإنسانية (أقسام الطالبات)	۳۰ يوماً	711,110	عدة شركات	٣	توريد وتركيب لوحات كهربائية	۱۳
كلية إدارة الأعمال بالحوطة	شهر	72,10.	مؤسسة دار الشعاع العالمية	١	تركيب لوحة	١٤
كلية المجتمع بالأفلاج، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج، كلية هندسة وعلوم الحاسب، كلية العلوم الدراسات الإنسانية بالسليل	۳۰ يوماً	٣٧٢,٠٠٠	مؤسسة مساعد سعد الشقران للتجارة	Y	توريد وتركيب مكيفات	10
إدارات وكليات الجامعة والمركز الطبي التعليمي	٢٥ يوماً	017,971	عدة شركات	٥	تأمين مطبوعات	١٦
صحيفة الجامعة	شهر	194,***	درة الإعلام للدعاية والإعلان	١	تأمين مطبوعات	1٧
إدارة العلاقات العامة	سنة	۱۰۸,۰۰۰	وكالة وضوح الرؤية للدعاية والإعلام	١	تصميم وعرض المواد الإعلانية الخاصة بالجامعة على الشاشة التلفزيونية	۱۸
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	شهرین	٩٠,٠٠٠	مؤسسة التقنية الجيدة	1	إنتاج فلم وثائقي عن الجامعة	19
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	مليون رسالة	00,***	شركة حلول التقنية المثالية	1	إرسال الرسائل القصيرة عبر الإنترنت	۲.
كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالحوطة	٢٥ يوماً	74,82.	مجموعة الفيصل للأنظمة الاعلان الحديثة	1	توريد وتركيب لوحات بمسمى جامعة سلمان	71
	۳ شهور	17.,	مكتب دخيل الله سعد السيالي للهندسة المدنية	1	تصنيع مجسم لمشروع جامعة سلمان بن عبدالعزيز	77



مستلزمات تعليمية بند رقم (٢/٢٢٢) لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	م
عمادة السنة التحضيرية	أسبوع	191,771	مؤسسة التماثل التقني للتجارة	١	تأمين مستلزمات تعليمية	١
كلية العلوم الطبية التطبيقية (الطالبات)	شهر	197,***	مؤسسة التماثل التقني للتجارة	١	تأمين مستلزمات تعليمية	۲
كلية هندسة وعلوم الحاسب	شهر	٦٠,٨٠٥	مؤسسة بيت الرياض الجريسي	١	تأمي <i>ن</i> قاعات مذاكرة لطلاب	٣
كلية طب الأسنان	شهر	٤٦,٩٨٠	مؤسسة سعد محمد العدواني للتجارة	١	تأمين وتركيب خزائن لحفظ الأدوات الخاصة	٤
لبعض الكليات	۱۰ أيام	147,000	مؤسسة التماثل التقني للتجارة	١	تأمين مستلزمات تعليمية	٥
إدارة الجامعة والمركز الطبي	١٠أيام	110,727	شركة غزاي بن غنام البدراني الحربي	١	تأمين مستلزمات مكتبية	٦
كلية إدارة الأعمال بالحوطة	أسبوع	TO, + A +	مؤسسة ربوع الإبداع للتجارة	١	تأمين مستلزمات تعليمية	٧
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	١٥ يوماً	194,000	مؤسسة الحزنوي التجارية	١	تأمين مستلزمات تعليمية	٨
كلية الهندسة بوادي الدواسر	١٥ يوماً	٧٢,٠٠٠	مؤسسة ركن البراءة للتجارة	1	تأمين مستلزمات قاعة الرسم الهندسي	٩
كلية العلوم والدراسات الإنسانية (أقسام)	ه٤ يوماً	۸۱,٤٠٠	مؤسسة مصدر الإبداع للتجارة	1	توريد وتركيب أجهزة بروجيكتر وشاشات عرض	١٠



مستلزمات تعليمية بند رقم (٢/٢٢٢) لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الإنسانية	أسبوع	14,000	مؤسسة مصدر الإبداع	١	تورید وترکیب جهاز بولیکم مع مایکروفونات خارجیة	11
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج طالبات	شهران	۱۸۰,۷٤٧	مؤسسة مصدر الإبداع	١	توريد وتركيب نظام صوتي ومرئي	17
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس و الموظفين وكلية العلوم والدراسات الإنسانية	أسبوع	٧٢,٠٠٠	مؤسسة الميكنة التجارية	١	تأمين جهاز المصحح الآلي	۱۳
كلية الطب وكلية العلوم والدراسات الإنسانية	١٥ يوماً	191,000	مؤسسة الحزنوي التجارية	1	مستلزمات تعليمية للقاعات الدراسية	١٤
إدارة العلاقات العامة	أسبوع	۲۷٥,٠٠٠	شركة اللمحات العصرية لفن المعارض	۲	استئجار بعض المستلزمات والتجهيزات للمسرح	10



التأمينات الطبية (لعام ١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية الطب	شهران	777,881	مؤسسة سسنبر العالمية	١	تجهيز قاعات الدروس العلمية لمادة التشريح وعلم الأجنة وكذلك جثث آدمية	١
كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر	۳۵ يوم	££٣£7 Y	عدة شركات	*	تأمين بعض التجهيزات الخاصة بمعامل التمريض	۲
كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر	٤٠ يوماً	77.,90.	مؤسسة النظرة الطبية	١	تأمين بعض المستهلكات والأدوية والتحاليل	٣
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج	شهران	۳۸۷,۰۰۰	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	١	توريد وتركيب أجهزة لقسم الأشعة والتصوير الطبي	٤
كلية الطب	٤ أسابيع	101, £9,	مؤسسة سسنبر العاليمة	١	تجهيز مستودعات لحفظ الجثث الخاصة بالمشرحة التعليمية	٥
كلية طب الأسنان	٤٠يوم	٤٩٨,٣٥٠	مؤسسة عبدالله المضحي التجارية	٤	توريد أدوات خاصة	٦
كلية طب الأسنان	٦٠يوم	1,100,770	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة	٣	توريد أجهزة تعقيم وأجهزة تنظيف	٧
كلية طب الأسنان	۳۰ يوم	1,797,900	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة	Y	تأمين عيادات جذور الأسنان واللثة	٨
كلية طب الأسنان	٤ أشهر	٣٨١,١٤٢	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة	١	توريد أجهزة أشعة	٩
كلية طب الأسنان	٤ أشهر	٦٨٨,٩٨٠	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة	١	توريد عيادات جراحة الوجة والفكين	١٠
كلية طب الأسنان	٤ أشهر	017,70.	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة	•	تورید وتجهیز معمل أسنان لعدد (٦) فنیین	11



التأمينات الطبية (لعام ١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية طب الأسنان	٣ أشهر	0	مؤسسة سعد محمد العدواني	١	تجهيز عيادة كبار الشخصيات وتوسعة غرفة معمل الفانتوم وتجهيز مستودع خاص بالمواد الطبية وغيرها	17
المركز الطبي التعليمي	شهر	١٧٨,٥١٠	مؤسسة سعد محمد العدواني	١	توريد مستلزمات طبية	۱۳
المركز الطبي التعليمي	شهر	108,177	مستودع أدوية ركن الهدى	١	توريد أدوية للمركز الطبي	١٤
المركز الطبي التعليمي	شهر	71,	الشركة السعودية لتموين المستشفيات المحدودة	١	تأمين جهاز قياس البول لاسلكي	10
المركز الطبي التعليمي	أسبوعان	701,000	شركة الجيل الطبية التجارية المحدودة	١	توريد وتركيب أجهزة مختبر الأنسجة	١٦
المركز الطبي التعليمي	أسبوعان	799,	شركة إمداد للأعمال الطبية المحدودة	١	تأمين جهاز فراكشنال ليزر لصنفرة البشرة	۱۷
المركز الطبي التعليمي	أسبوع	101,710	مؤسسة تحديات الطبي للتجارة	١	تأمين بعض الأدوات والآلات الجراحية	١٨
المركز الطبي التعليمي	شهران	179,770	شركة الجيل الطبية والتجارية المحدودة	١	تأمين كشافات الفحص المتحركة عدد (١٣)	19
المركز الطبي التعليمي	٤٠ يوم	754, • 74	عدة شركات	۲	تأمين بعض المستلزمات والمستهلكات الطبية للعيادات والأقسام الإكلينيكية	۲٠
المركز الطبي التعليمي	۲۰ يوم	181,989	عدة شركات	۲	تأمين منظار جراحي لتنظير المستقيم ومنظار شرجي	۲١



تجهيز وتأثيث المعامل والكليات لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم الدراسات الإنسانية بالسليل	شهران	٥٧٨,٦٩٠	مؤسسة عبدالله محمد الصانع للتجارة	١	تجهيز وتأثيث معملين مدمج للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية	١
كلية العلوم الدراسات الإنسانية بالسليل	شهر	1.4,7.	مؤسسة عبدالله محمد الصانع للتجارة	١	توريد وتركيب بنشات وأثاث مختبر الفيزياء	۲
كلية العلوم الدراسات الإنسانية بالسليل	١٥ يوماً	11+,	شركة جاكو للغازات	١	تأمين غازات للمعامل	٣
كلية الصيدلة	أربع أشهر	970,17	مؤسسة تكافل العمل للتجارة	١	تجهيز معمل المحاكاة والمهارات السريرية	٤
كلية الطب	۲۰ يوم	1,147,7**	مؤسسة الحربي للمشروعات التعليمية	4	تأمين معلم الرابوت ومعمل الأنظمة الرقمية	٥
كلية هندسة وعلوم الحاسب	٤٠ يوم	٧٨١,٠٠٠	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	۲	توريد أجهزة معامل للطلاب	٦
كلية طب الأسنان	ه٤ يوم	۲۸۷,۰۰۰	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	١	تأمين أجهزة ومواد لمعمل الأسنان	٧
كلية طب الأسنان	٤ أشهر	007,1	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	١	تورید وترکیب معمل تشریح لعدد (۳۲) طالب	٨
كلية طب الأسنان	٤ أشهر	702,	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	١	توريد مغاسل وكبائن وأجهزة لمعامل الطلاب	٩
كلية طب الأسنان	شهران	٣٢٠,٠٠٠	مؤسسة عبدالله المضحي التجارية	١	تأمين طاولات أشعة	1.



تجهيز وتأثيث المعامل والكليات لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية الهندسة	٣ أشهر	٦٨٥,٧١٥	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	١	توريد وتركيب معمل إلكترونيات القدرة	11
كلية الهندسة	٥٦ يوم	981,707	عدة شركات	۲	توريد وتركيب معمل تكنولوجيا الخرسانة ومواد التشييد	١٢
كلية الهندسة	٤٠ يوم	٤١١,١٦٩	عدة شركات	4	توريد وتركيب معمل هندسة البيئة	۱۳
كلية الهندسة	۲۰ يوم	٥٧١,٣٠٠	عدة شركات	۲	توريد وتركيب معمل الميكاترونيك	١٤
كلية الهندسة	شهران	701,978	شركة عبدالعزيز رجب وعبدالله سلسله وشركائهم	•	توريد وتركيب معمل القياس والمعدات	10
كلية العلوم والدراسات الإنسانية (أقسام الطالبات)	ه٤ يوم	797,97•	مؤسسة التماثل التقني للتجارة	۲	تجهيز وتأثيث قاعات الطالبات والمسرح	١٦



خدمات وبرامج الحاسب الآلي والشبكات لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم الدراسات الإنسانية بالسليل	شهران	1.9,988	شركة القلعة الدولية	١	تأمين شبكة داخلية	١
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	۱۸ شهراً	۸۰,۰۰۰	مؤسسة رويفد الصاعدي	١	تأمين وتجهيز موقع إلكتروني خاص بالتوظيف	۲
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج	٣ أسابيع	٤١,٠٥٠	شركة زوف للتقنية	١	تأمين برامج مني تاب	٣
كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بالأفلاج وكلية التربية للبنات بوادي الدواسر	۳ شهور.	٤٩٩,٠٠٠	شركة فكر التقنية	٣	توريد وتركيب وتأمين شبكات داخلية	٤
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد إدارات الجامعة والعمادات	٤ شهور	1, • £9, £ £ •	مؤسسة دار بيتا للتكنولوجيا المعلومات	۲	تنفيذ أعمال توسع شبكة الحاسب وتجهيز مركز المعلومات	٥
مبنى فك الارتباط بالرياض	شهر	٥٩,٨٠٠	شركة بسمة الجزيرة للإلكترونيات	١	تركيب سنترال هاتفي رقمي مجهز لسعة (٨) خط خارج و(٤٨) داخلي	٦
كلية إدارة الأعمال بالحوطة	شهر	TT • , AVO	مؤسسة ربوع الإبداع للتجارة	١	توريد وتركيب وفحص واختبار كامل شبكة الحاسب الآثي	٧
تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	۲ شهور	۸٤٩,٩٦٠	الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب الآلي	۲	تشغيل النظام الإداري والمالية	٨
تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	۳ أشهر	٦٠٠,٠٠٠	الشركة الوطنية للتسويق المحدودة	١	توريد وتركيب نظام الاتصالات الإدارية	٩
تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	شهران	٣ ٢٩,٣٣٢	شركة ويبرو العربية	1	تأمين نسخ أصلية من برامج شركة مايكروسفت	1.



ترميمات واضافات لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الإنسانية والمجتمع بالحرم الجامعي	۲۰ يوم	٤٩٧,٣٩٠	مؤسسة التميمي للمظلات والسواير	۲	تأمين وتركيب مظلات للسيارات	١
المدينة الجامعية والكليات التابعة لها مستشفى الملك خالد بالخرج	٦٠ يوم	Y7+,99+	عدة شركات	۲	تأمي <i>ن</i> وتنفيذ عدد (١٠) غرف للأمن وتوريد وتركيب التمديدات الكهربائية	۲
كلية الطب	ەە يوماً	9,	شركة تشييد المعمارية للمقاولات والتجارة	١	إنشاء وحدة كلية الطب	٣
مكتب معائي مدير الجامعة	٤٠ يوم	189,700	مؤسسة بوابة التراث للمقاولات العامة	۲	توريد وتركيب قواطع جبسيه وزجاجية	٤
كلية التربية للبنات بالدلم ، كلية العلوم	شهر	18.,	شركة إبراهيم صالح المقبل	\\	ترميم مكتب	٥
الدراسات الإنسانية بالأفلاج	۳ شهور	1,899,007	عدة شركات	٤	ترميم مباني	٦
عمادة شؤون الموظفين ، الإدارات المساندة للوكالة ، قاعة التشريفات بالحرم الجامعي ، إدارة المشتريات ، وكالة الجامعة للدراسات العليا ، وكالة الجامعة ، كلي التربية للبنات بالخرج	۲۰ یوم	1,£77,070	عدة شركات	٧	إعادة تأهيل	٧
مبنى الجامعة	۱۰أيام	197,14.	بوابة التراث للمقاولات	١	تورید عدد (٤٢٨) نباتات داخلیة	٨
	۳۰ يوم	٦٠,٢٩٠	تشييد المعمارية	1	أعمال الوحدة الصحية	٩



ترميمات واضافات لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج طالبات	۲۵ یوم	٣١ ٢,٤٦٠	شركة تشييد المعمارية	۲	ترميم دورات مياه مرحلة أولى وثانية	١.
كلية إدارة الأعمال	۱۵ يوم	18,91.	شركة تشييد المعمارية للمقاولات والتجارة	١	تنفيذ دورات مياه للمعاقين ومنحدر	11
	٤٠ يوم	077,100	مؤسسة عبدالعزيز الرويلي للمقاولات	١	ترميم وإعادة تاهيل القسم الإداري لمكتب مدير الجامعة	۱۲
كلية التربية بالدلم	۲۵ یوم	۸٦,٥٠٠	شركة تكنولوجيا لامة	۲	إصلاح وصيانة مكيفات الفريون والصحراوي وتوريد وتركيب برادات ماء	۱۳
كلية التربية بالدلم	۱۵ یوم	۸۸,٦٠٠	شركة تكنولوجيا لامة	۲	توريد وتركيب بلاط كسر رخام وتقطيع الأشجار وإزالة الحشائش وتجهيز حاويات للمخلفات	١٤



معدات و سیارات بند رقم (۲۲۴) لعام (۱٤۳۲هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
إدارة الخدمات (قسم الحركة)		حسب عدد السيارات المضافة	شركة العلم لأمن المعلومات	٣	الاشتراك بخدمة (تم) الخاصة بنظام التعاملات المرورية	١
إدارة الخدمات	٣ أيام	٣٤,٠٠٠	مؤسسة الريان للتجارة والمقاولات	١	تأمين عربة كهربائية لعدد (٦) ركاب	۲
إدارة النقل (قسم الحركة)	۹۰ يوم	۳۷۱,٤٠٠	شركة عبداللطيف جميل المحدودة للسيارات	4	تأمين باص تويوتا كوستر لعدد (٢٦) راكب موديل (٢٠١٢)	٣
إدارة النقل (قسم الحركة) (عمادات الكليات	شهران	٤٦٢,٠٠٠	شركة الوعلان للسيارات	١	تأمين عدد (١١) سيارات هيونداي إكسنت	٤
المركز الطبي التعليمي	ه٤ يوماً	٧٠٠,٠٠٠	مؤسسة سكان العالمية	١	سیارة إسعاف عدد (۲) مودیل ۲۰۱۰	٥
وكيل الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	۳۰ يوم	٣٠٠,٠٠٠	شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات	*	تأمين سيارة مرسيدس بنز عدد(٢)	٦
كلية العلوم والدراسات الانسانية بالخرج طالبات	٤٠ يوم	170,***	شركة الزاهد للتركتورات	1	توريد مولد كهربائي	٧



خدمات الأمن والسلامة لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج طالبات	ه أيام	۲,٠٩٨	شركة الزاهد للتركتورات	١	صيانة وقائية للمولد الكهربائي	١
المستشفى الجامعي ، كلية طب الأسنان	٤٠ يوم	777,577	مؤسسة مصدر الإبداع للتجارة	۲	تأمين كاميرات مراقبة	۲

إعلانات وتجهيزات لعام (١٤٣٢هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
إدارة العلاقات العامة	أسبوع	٣٨,٤٠٠	شركة اللمحات العصرية لفن المعارض	١	تنفيذ الجناح الخاص بجامعة الخرج في معرض التوظيف السعودي	١



منافسات عام (۱٤٣٣هـ)

الجهة المشرفة	المدة	قيمة الترسية	اسم الشركة/المؤسسة	اسم المنافسة	م
المشاريع والصيانة	٣ سنوات	٤,٢٠٠,٠٠٠	صحارى للخدمات المحدوده	صيانة ونظافة كلية الهندسة وعلوم الحاسب وكلية إدارة الأعمال بالخرج	١
المشاريع والصيانة	٤ أشهر	0,99٧,٠٠٠	المجد للأعمال الكهروميكانيكية	توريد وتركيب عدد ٢ مولد طاقة احتياطي للمدينة الجامعية	۲
المستشفى الجامعي	٣ أشهر	900,900	ريان الطبية	توريد وتركيب نظام أرشفة الصور الطبية ونظام سجلات قسم الأشعة بالمركز الصحي	٣
المستشفى الجامعي	٣ سنوات	۲,۹۹۸,٤٦١	ملغاة	صيانة الأجهزة الطبية بمركز الخدمات الصحية التعليمي	٤
المشاريع والصيانة	۳ سنوات	7,991,217	الحبايب للمقاولات	نظافة وصيانة وأعمال الري والمزروعات بالمدينة الجامعية	٥
كلية الهندسة	۹۰ یوم	تحتالترسية	زان الحديثة المحدوده الحربي للمشروعات التعليمية اصيلا الرياض	توريد وتركيب معمل أبحاث الطرق والمواصلات بقسم الهندسة المدنية	٦
كلية هندسة وعلوم الحاسب	٤ أشهر	٣,٤٠٢,٦٧٨	الحربي للمشروعات التعليمية	توريد وتركيب عدد ٤ معامل أبحاث لكلية هندسة وعلوم الحاسب	٧
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	۱۰ اسابیع	٤,٤٩٠,٠٠٠	مجموعة شركات سمير	مشروع تجهيز القاعات النموذجية المطورة (المرحلة الأولى)	٨
عمادة السنة التحضيرية	سنة	11,74	المجموعة للتعليم والتدريب	تشغيل وإدارة السنة التحضيرية	٩
إدارة الأمن والسلامة والمشاريع والصيانة	شهران	۸,۵۷٦,۳۲٥	تكنولوجيا لامة	مشروع أعمال السلامة لعدد (٦) مباني لكليات البنات	١٠



تابع منافسات عام (۱٤٣٣هـ)

الجهة المشرفة	المدة	قيمة الترسية	اسم الشركة/المؤسسة	اسم المنافسة	م
إدارة المشاريع والصيانة	سنتين	٤٣,٣٩٦,٤٨٥	ارزام للتجارة والمقاولات	مشروع إنشاء مبنى المعامل بكلية الهندسة بالخرج	11
إدارة المشاريع والصيانة		٣,0٤0,10٤	شركة تشييد المعمارية	مشروع إنشاء مستودع أثاث بمحافظة وادي الدواسر والسليل	١٢
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	اسبوعين	١,٨٨٨,٠٤٥,٧٦	ويبرو العربية المحدوده	تجديد رخص برامج وتطبيقات مايكروسوفت لأجهزة الحاسب الآلي بالجامعة	۱۳
إدارة المشاريع والصيانة	شهران	٧,٩٢٢,٥٣٥	محمد السعيد للمقاولات	توريد وتركيب مظلات لمباني كليات البنات التابعة للجامعة	١٤
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	٣ سنوات	10,097,781	أنظمة الكمبيوتر السعودي	توريد وتركيب وتشغبل بوابة التعلم الإلكتروني	10
إدارة المُشتريات	٤ أشهر	٤,٥٩١,٩٩٥	مؤسسة وفال العالمية مؤسسة الحزنوي التجارية مؤسسة الدرع الثابت شركة أبناء قاسم الدريويش شركة المكاتب المحدودة شركة الجريسي شركة الهوشان شركة تجهيز العالمية المحدودة	توريد وتركيب أثاث ومستلزمات مكتبية	17
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	٤ أشهر	7,707,007	بعد للاتصالات السلكية والاسلكية	مشروع تطوير وتحسين الشبكات المحلية لبعض مقرات الجامعة	۱۷



تابع منافسات عام (۱٤٣٣هـ)

الجهة المشرفة	المدة	قيمة المترسية	اسم الشركة/المؤسسة	اسم المنافسة	م
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	٣أشهر	7,777,700	مؤسسة الدرع الثابت	توريد وتركيب عدد ١٢ معمل حاسب آلي مدمج	۱۸
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	شهران	1,.11,77	دائرة التحكم	مشروع أعمال السلامة لكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر	19
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	٣أشهر	1,997,580	ضياءالمشارق	مشروع إنشاء بيت الحيوان في المدينة الجامعية	۲.
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	۳٦٠ يوم	٧,١٦٥,٣٩٤	مؤسسة الروابط الذهبية للمقاولات	إنشاء مبنى المعامل بكلية التربية للبنات بحوطة بني تميم	۲۱
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	سنة	79, £17, 900, 71	تحت التنفيذ	مشروع إنشاء مبنى التشغيل والصيانة	**
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة	۲۸۰ یوم	٤,٦٤٤,٧٦٨	مؤسسة التقنية الاستشارية	إنشاء مبنى الفصول الدراسية الإضافية لكلية العلوم الطبية التطبيقية	77



مستلزمات تعليمية بند (٢/٢٢٢) لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية إدارة الأعمال بالحوطة ، كلية التربية بوادي الدواسر	٤٠ يوم	٧١٧,٥٧٠	مؤسسة الدرع الثابت	۲	تأمين متطلبات	١
كلية التربية للبنات بالحوطة ، كلية التربية بوادي الدواسر	۰ه یوم	098,800	عدة شركات	٣	تأمين مستلزمات تعليمية	۲
كلية التربية بوادي الدواسر	ه أيام	۲۱۳,۰۰۰	مؤسسة وفال العالمية	١	تورید ک را <i>سي</i> دراسیة	٣
قسم التربية الخاصة بالجامعة	٣ أسابيع	177,7**	مؤسسة النظم السعودية للأعمال التجارية	١	تأمين وسائل تعليمية مساعدة لالتحاق الطلاب المكفوفين	٤
بعض كليات وإدارات الجامعة	۲۰ يوم	٥٣٧,٦٧٢	عدة شركات	٣	تأمين أدوات ومستلزمات مكتبية	٥
كلية العلوم والدراسات الإنسانية	۲۰ يوم	٥٨٢,٧٥٠	عدة شركات	٤	تأمين مستلزمات تعليمية وأجهزة حاسب	٦
كليات البنات	ه أيام	١٧٨,٠٠٠	مطبعة مملكة الطباعة	١	تأمين كراسات إجابات	٧
بعض كليات الجامعة	٥١يوماً	197,000	مؤسسة الحاسوب العصري	١	تأمين مستلزمات تعليمية	٨
المكتبة المركزية	۲۰يوماً	YoV, £	مؤسسة أضواء الشامل للكمبيوتر	1	تنفيذ مشروع قاعة الحاسب الآلي	٩
كلية طب الأسنان	أسبوع	119,000	مؤسسة الحزنوي التجارية	١	تأمين مستلزمات تعليمية	١٠
إدارات وكليات الجامعة	أسبوعان	1.0,470	مؤسسة غزاي غنام البدراني الحربي	1	تامين أدوات مكتبية	11



مستلزمات تعليمية بند (٢/٢٢٢) لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية إدارة الأعمال والعلوم والدراسات الإنسانية	أسبوعان	199,700	الذاكرة الأولى للتجارة	١	تأمين مستلزمات تعليمية	17
كلية المجتمع بالخرج	أسبوعان	197,***	مؤسسة الحاسوب العصري للتجارة	1	تأمين مستلزمات نعليمية	۱۳
كلية التربية بنات وكلية إدارة الأعمال	أسبوعان	127, * * *	الذاكرة الأولى للتجارة	1	توريد وتركيب مستلزمات تعليمية	١٤



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
مكتب معائي مدير الجامعة	ه٤ يوماً	77.,	وكالة دار التقاء لدعاية والإعلان	١	تجهيز ديكور وتأمين أثاث مكتبي	١
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية	۳۰ يوم	777,•10	عدة شركات	۲	توريد وتركيب قواطع وأثاث مكتبي	۲
مكتب وكيل الجامعة	أسبوع	199,	مؤسسة الحاسوب العصري	1	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	٣
كلية الطب	٤٠ يوم	٤٢٥,٤٤٠	عدة شركات	٣	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	٤
بعض إدارات وكليات الجامعة	۳۰ يوم	T IV, • 0 •	عدة شركات	۲	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	٥
كلية العلوم والدراسات الإنسانية (الطالبات)	أسبوع	17.,98.	مؤسسة بيت الرياض الجريسي	١	تأمين وحدات عمل	٦
عمادة القبول والتسجيل والسنة التحضيرية	أسبوعان	109,970	مؤسسة تطوير الإنجاز	١	توريد أثاث ومستلزمات مكتبية	٧
مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر	أسبوع	191,100	مؤسسة الحزنوي التجارية	١	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	٨
كلية طب الأسنان	۲۰ یوم	۳۸۲,۱۰۰	مؤسسة الحزنوي التجارية	۲	تأمين عدد (٤) جهاز لحفظ الملفات	٩
المستشفى الجامعي	أسبوع	118,011	شركة بيت الرياض الجريسي	١	تأمين طابعة بطاقات بلاستيكية	١٠
عمادة القبول والتسجيل	۲۰ یوم	٧٩,٥٥٠	عدة شركات	٣	تأمي <i>ن م</i> طبوعات	11



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	م
كلية طب الأسنان	شهر	147,4**	مطابع الخالد للأوفست	1	تأمي <i>ن مطبو</i> عات	١٢
المستشفى الجامعي	أسبوع	۱۰۸,۰۰۰	مطبعة مملكة الطباعة	١	تأمين مطبوعات	۱۳
عمادات وإدارات الجامعة	شهرين	70,9	مطابع الاشعاع	١	تأمين مطبوعات	١٤
وكالة الجامعة للدراسات العليات والبحث العلمي	أسبوع	18,70.	وكالة مودان للدعاية والإعلان	١	تصميم وطباعة كتيب اللائحة المنظمة لكراسي البحث	10
إدارات وكليات الجامعة	۳۰ يوم	۲۸۰,٥٠٠	مؤسسة الحاسوب العصري للتجارة	۲	تأمين أحبار	١٦
كلية التربية بوادي الدواسر	۲۵ یوم	٤٣٩,٩٧٠	مجموعة دائرة التحكم	١	تركيب قواطع مكتبية	۱۷
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية	أسبوع	۱۸۸,۸۰۰	مؤسسة الحزنوي للتجارة	١	تأمين أثاث وممستلزمات مكتبية	۱۸
بعض العمادات	۷ أيام	Y0,9VY	شركة الجديعي للأثاث المكتبي	١	تأمين عدد ١٠ وحدات عمل مكتبي مع الكراسي	19
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية	أسبوعان	170,	مطبعة مملكة الطباعة	١	تأمين عدد ۱۰۰,۰۰۰ كراسة اجابة	۲.
كليات الجامعة	٣٥ يوماً	194,700	مصنع الباشا	1	تأمين وحدات أرفف وطبليات	71
المستودع المركزي	٣ أسابيع	192,02+	مؤسسة إنماء الشرق التجارية	١	تجهيز وتأثيث بعض كليات الجامعة	77



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
وحدات وإدارات الجامعة	۱۲ يوماً	147, * * *	مؤسسة الحاسوب العصري للتجارة	١	تأمين أحبار لغرض صيانة الآت تصوير	77
	٤ أيام	120, * * *	وكالة مودان للدعاية والاعلان	١	تنفيذ معرض الجامعة بالمؤتمر الدولي للتعليم العالي ٢٠١٢	71
عمادة القبول والتسجيل	ه٤ يوماً	727,0	شركة الملز للتقنية والاتصالات	١	تأمين وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية	40
المركز الطبي التعليمي	١٥ يوماً	199,900	مؤسسة وقت الخبراء للتجارة	١	تاثيث وتجهيز المطبخ والمعيشة	77
إدارات وكليات الجامعة	١٥ يوماً	177, . ٧ .	مؤسسة الدرع الثابت	1	تامين أثاث ومستلزمات مكتبية	**
صحيفة الجامعة	أسبوعان	198,800	مؤسسة إنماء المشرق التجارية	١	تامين أثاث ومستلزمات مكتبية	۲۸
المشاريع والصيانة	۳۰ يوماً	۲00,۸V+	مجموعة دائرة التحكم	١	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	49
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	أسبوعان	٣٤,٠٠٠	وكالة مودان للدعاية والاعلان	١	تصميم وطباعة التقرير السنوي	٣.
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	ه٤ يوماً	117,72.	مؤسسة عصر التراث للتجارة	١	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	٣١
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس	أسبوع	٧٠,٠٠٠	وكالة مودان للدعاية والاعلان	١	تصميم وطباعة التقرير السنوي	44
عمادة القبول والتسجيل	۱۰ أيام	17,770	مجموعة دائرة التحكم	1	تامين مستلزمات مكتبية	٣٣



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
المدينة الجامعية	أسبوع	٤٩,٩٠٠	مؤسسة عبدالعزيز محمد السعيس	1	توريد وتركيب مواد كهربائية	٣٤
عمادة القبول والتسجيل	٥١يوماً	۲۹۳, ۱۷ •	مؤسسة تطوير الانجاز للتجاره	١	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	٣٥
مركز الاتصالات الإدارية	۱۰ يوم	77,977	مؤسسة المقاولات العربية للمقاولات	1	توريد صناديق البريد للجامعة	41
المستشفى الجامعي	شهران	٤٢,٣٢٠	مصنع الأدوات والمستلزمات الطبية	١	تأمين أرفف لمستودعات عيادات الأسنان	٣٧
المشاريع والمصيانة	ه أيام	٣٢,٠٠٠	شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدوده	١	تأمين جهاز مساحي (محطة رصد متكاملة)	٣٨
إدارة المستودعات	أسبوعان	۲۹ ۸, ۹••	الذاكرة الأولى للتجارة	١	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	44
إدارات الجامعة	٣ أسابيع	177,000	النظم السعودية للأعمال التجارية	١	تامين أثاث ومستلزمات مكتبية	٤٠
مكتب معالي المدير	١٥ يوماً	1٧,***	شركة سماء الثريا للديكور	١	توريد وتركيب ستائر لمكتب معالي مدير الجامعة	٤١
عمادة تقنية المعلومات	۲۰ يوماً	۱۸٦,۸۲۱	شركة الجديعي للأثاث المكتبي	١	توريد وتركيب وحدات عمل مكتبية	٤٢
إدارة العلاقات العامة والإعلام	٣٦٠ يوماً	١٠٨,٠٠٠	وكالة وضوح الرؤية للدعاية والإعلان	١	تصميم وعرض المواد الإعلانية الخاصة بالجامعة	٤٣
لجنة الفعاليات العامة	أسبوع	۲۰۰,۰۰۰	شركة اللمحات العصرية لفن المعارض	١	إعداد وتجهيز مسرح الجامعة بالمدينة الجامعية	٤٤



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
المستودع المركزي	أسبوعان	149,	مؤسسة سولان للتجارة	١	تامين أثاث ومستلزمات مكتبية	٤٥
المستشفى الجامعي	شهران	۸٧,٥٠٠	مطابع الاشعاع	١	تأمين عدد ٥٠٠٠ ملف طبي	٤٦
المستودع المركزي	أسبوع	177,7	مؤسسة الحزنوي التجارية	١	تأمين اثاث ومستلزمات مكتبية	٤٧
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	٣ أسابيع	197,٧٠٠	مؤسسة الحزنوي	١	تامين اجهزة حاسب آلي وطابعات	٤٨
المكتبة الجامعية	۲۵ يوماً	1.4,9	مؤسسة تحفة أوغاريت	١	توريد وتركيب مكاتب وكاونترات	٥٠
عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين	٢١يوماً	۳۸,٥٥٠	مؤسسة بيت الرياض الجريسي	١	تأمين جهاز إصدار بطاقات العمل القسم النسوي	٥١
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	أسبوعان	100, ٧٠٠	مؤسسة إنماء المشرق التجارية	١	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	۲٥
مكتب معالي مدير الجامعة	أسبوع	149,7**	مؤسسة الحزنوي التجارية	١	تأمين أثاث ومستلزمات مكتبية	٥٣



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
لجنة الفعاليات والمناسبات العامة	أسبوع	177,000	قلاع العلم للطباعة	١	تأمين دليل كليات الجامعة لتوزيعه بمعرض وزارة التعليم العالي	٥٤
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	اسبوعان	٣٤,٠٠٠	مؤسسة غزاي غنام البدراني الحربي	١	تأمين حامل بطاقات العمل مع طباعة الشعار على الحامل	00
لجنة الفعاليات والمناسبات العامة	أسبوع	71,000	مركز نسخكم للنسخ والتصوير	1	تأمين مطبوعات لمشاركة الجامعة في المعرض الدولي	70
إدارات وكليات الجامعة	شهر	108,778	مؤسسة غزاي غنام البدراني للتجارة	١	تأمين أدوات مكتبية	٥٧



تجهيز وتأثيث المعامل والكليات لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية الطب	۱۰ أيام	177,7**	مؤسسة تكافل العمل للتجارة	١	استكمال معمل محاكاة المهارات	١
كلية الطب	٣أشهر	107,110	مؤسسة الرائز لنظم البيئة والتقنيات المتقدمة	١	تجهيز معمل علم وظائف الأعضاء	۲
كلية الطب	٣أشهر	1.1,178	شركة أصيلا الرياض للتجارة	1	تجهيز معمل علم الأحياء الطبية الدقيقة	٣
كلية الطب	٣أشهر	££,0TV	شركة أصيلا الرياض التجارية	١	تجهيز معمل التشريح	٤
كلية طب الأسنان	٣أشهر	97,200	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة	١	تأمين أسنان لمعمل الفانتوم	٥
كلية العلوم والدراسات الإنسانية	٣أشهر	708,	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	١	توريد وتركيب معمل تطبيقات الحاسب لقسم العلوم والفيزياء	٦
كلية العلوم والدراسات الإنسانية	٣أشهر	۸٦٥,٠٠٠	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	١	توريد وتركيب معمل أبحاث مشاريع التخرج	٧
كلية العلوم والدراسات الإنسانية	أسبوع	199,700	مؤسسة الحزنوي التجارية	١	تأمين معمل حاسب آلي بسعة (٤٠) طالب	٨
كلية الصيدلة	أسبوع	۸۰,۱۵۰	مؤسسة الدرع الثابت للتجارة	1	تأمين عدد (١٠) أجهزة حاسب آلي	٩
كلية التربية للبنات بالدلم ، كلية التربية بالحوطة	شهران	٤٣,٩٩٠	الشركة السعودية للتسويق والتجارة	١	تأمين مواد كيماوية وأدوات خاصة بالمختبرات	1.



تجهيز وتأثيث المعامل والكليات لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	٦
كلية الهندسة بوادي الدواسر	٤ أشهر	٤٦٥,٨٤٠	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	1	توريد وتركيب معمل الدوائر الكهربائية	11
كلية الهندسة بوادي الدواسر	ه أشهر	٣٢0,97 •	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	١	توريد وتركيب معمل التصميم المنطقي	17
كلية الهندسة بوادي الدواسر	١٥ يوماً	717,777	مؤسسة عبدالله محمد الصانع للتجارة	١	توريد وتركيب معمل الكيمياء	۱۳
كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر	شهران	٣٠٦,١٤٩	شركة سيسنبر العالمية	١	معمل التشريح والفسيوليجي	١٤
كلية الصيدلة	٣ أيام	٧٦,٦٩٠	شركة آيرليكيد الخفرة للغازات الصناعية	1	تعبئة الغازات لتشغيل أجهزة المختبرات البحثية	10
طب الأسنان	ه أيام	٥٨,٣٦٠	مؤسسة وقت الخبراء	١	تأثيث وتجهيز سكن التمريض	١٦
كلية العلوم الطبية التطبيقية	٦٠ يوماً	07,1	مؤسسة الاشعة الصحية للتجارة	1	توريد وتجهيز معمل الفيزياء الإشعاعية	۱۷
كليات الجامعة	٣ أسابيع	79,70	شركة مصنع الادوات والمستلزمات الطبية المحدودة	١	تصنيع وحدة صيدلية	۱۸
المستشفى الجامعي	أسبوع	77,700	مصنع الادوات والمستلزمات الطبية	١	توسعة المختبرات للمستشفى الجامعي	19
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	أسبوع	۲۳,۳ ٦٠	مؤسسة فهد بشر الرشيد التجارية	١	تجهيز معمل الفيزياء	۲.



تجهيز وتأثيث المعامل والكليات لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم الطبية التطبيقية	ه أشهر	٧٢,٠٠٠	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	١	تجهيز معمل لقسم تقنية الأجهزة الطبية	71
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج	ه أشهر	٦٧٠,٠٠٠	شركة الحربي للمشروعات التعليمية	١	توريد وتركيب معمل أبحاث مشاريع الصيانة	77
كلية العلوم الطبية التطبيقية	ه أشهر	99.,	مؤسسة دانة الاختيار التجارية	١	توريد وتركيب أجهزة خاصة لمعمل القياسات الحيوية لقسم العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي	74
كليات البنات	٤٠ يوماً	900,***	شركة العساف للتقنية والمشاريع	١	تأمين عدد (٥) عيادات طبية	7 2
كلية الهندسة	۱۰ أسابيع	۳۸,۰۰۰	مؤسسة عبداللطيف حسين أبوا لجدايل	1	تأمين جهاز قياس الطيف الضوئي لمعمل البيئة	40
كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر	۸ أسابيع	227,200	مؤسسة سيسنبر العالمية للتجارة	١	استكمال تجهيز معمل وظائف الأعضاء	77



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم الطبية التطبيقية	أسبوعان	79,7	صائح عبدالمحسن الفائح التجارية	١	تأمين عدد (٦) أجهزة قياس تنفس	١
كلية الطب	٥١يوماً	174, ***	مؤسسة تطوير الإنجاز للتجارة	١	تجهيز وحدة التعقيم	۲
المستشفى الجامعي	٣ أشهر	97, 1	الشركة السعودية للتسويق والتجارية	١	تأمين ثلاجات طبية لحفظ وتخزين الأدوية واللقاحات	٣
المستشفى الجامعي	٤ أشهر	1.9,200	شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	١	تأمين شاشة مركزية لمتابعة الجنين وانقباضات الرحم لقسم الولادة	٤
المستشفى الجامعي	١٣ أسبوعاً	791,900	شركة الجيل الطبية والتجارية المحدودة	١	تأمين منظار رئوي لتنظير الشعب الهوائية	٥
المستشفى الجامعي	شهر	٤٧٩,٣٠٠	شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية	١	تأمين عدد (٢) جهاز لعيادات طب الأمراض الجلدية	٦
المستشفى الجامعي	أسبوعان	178,4.4	مؤسسة محمد سعد العدواني	١	تأمين مستلزمات ومعدات طبية	٧
المستشفى الجامعي	٣ أسابيع	17,178	شركة مناير نجد للتجارة واللوازم الطبية	١	تأمين أدوية للمستشفى الجامعي	٨
المستشفى الجامعي	٤ أشهر	72.,020	شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	١	تأمين عدد (٥) أجهزة لمتابعة الجنين وانقباضات الرحم	٩
المستشفى الجامعي	٢٥ يوماً	18,700	مجموعة الجعيثن للتجارة	١	تأمين أكياس بلاستيك للدواء	١٠
كلية طب الأسنان	شهران	٥٦٠,٠٠٠	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	١	توريد وتركيب أجهزة التيجان	11



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية طب الأسنان	٣ أشهر	٤٥,٠٠٠	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	١	توريد وتركيب مواد أجهزة طبية	١٢
كلية طب الأسنان	۳۵ يوم	727.70	مؤسسة عبدالله المضحي التجارية	٣	تأمين مواد وأجهزة طبية	۱۳
كلية طب الأسنان	۲۰ يوماً	۱۸۸,۷۸٤	مؤسسة سعد محمد العدواني	١	إنشاء مستودع طبي	١٤
المستشفى الجامعي	اسبوعان	170,798,88	الشركة السعودية العالمية للتجارة	١	تأمين أدوية	10
المستشفى الجامعي	شهران	18,719,00	شركة عبدالرؤوف ابراهيم بترجي واخوانه	١	تأمين أدوية	١٦
كليات البنات	يوماً	980,000	مؤسسة النخبة الوطنية للتجارة	١	تأمين عدد ه عيادات طبية بكليات البنات	۱۷
المستشفى الجامعي	۱۰ أيام	17,977,78	مستودع أدوية ركن الهدى	١	تأمين أدوية	۱۸
اقسام المركز الطبي	۳۰ يوماً	٤١٩,٦٨٥	مؤسسة نجمة حطين للتجارة	١	تأمين مستهلكات طبية	19
المستشفى الجامعي	۱۰ أيام	91,202,92	مستودع أدوية ركن الهدى	١	تأمين أدوية	۲.
المستشفى الجامعي	ه٤ يوماً	YY,0·•	مؤسسة سرابيل	١	تأمين أنابيب لحقن صبغات الأشعة المقطعية للمركز الطبي التعليمي	71
المستشفى الجامعي	۹ أسابيع	1.8,97.	شركة الجيل الطبية والتجاريةالمحدودة	١	تأمين كيماويات جهاز تجلط الدم وكيماويات جهاز الكيمياء الحيوية	**



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
المستشفى الجامعي	٥١يوماً	197,770	مؤسسة وقت الخبراء للتجارة	1	تأثيث وتجهيز سكن المركز الطبي التعليمي	**
المستشفى الجامعي	١٠ أيام	٩٨,٧٨٤,٣٧	مستودع أدوية ركن الهدى	١	تأمين أدوية	۲:
كلية الطب	۹۰ يوماً	751,505	شركة فاروق ومامون تمر وشركاهما	١	تأمين متطلبات المختبرات من المواد اللازمة لاستكمال الفحوص الأساسية للطلبة	۲,
المستشفى الجامعي	شهر	1.,7.9,10	مستودع أدوية ركن الهدى	١	تأمين أدوية	۲.
المستشفى الجامعي	۱۰ أيام	۲ ٦,٧٠٠	شركة مدار المبدعون للتجارة	,	تأمين أشرطة سكر الدم للمستشفى الجامعي	۲۰
المستشفى	۳۰ يوماً	717,72.,27	مستودع أدوية ركن الهدى	١	تأمين أدوية	۲,
المستشفى الجامعي	۱۲ أسبوع	٣٩٠,٠٠٠	مؤسسة النخبة الوطنية للتجارة	١	تامين جهاز تخطيط العضلات	۲
المستشفى الجامعي	۳۰ يوماً	۸۸,٤٠٦	مؤسسة محمد عبدالله يارشيد	١	تأمين أشعة صوتية وأوراق لأجهزة تخطيط القلب	٣
كليات الجامعة	٦٠ يوماً	٤٩,٥٠٠	مؤسسة عبدالله عبدالمحسن بن ياز للمستلزمات الطبية والتجارة	١	توريد وتركيب عدد١٥٠ صندوق إسعافات أوليه	٣
كلية الصيدلة	۱۰ أسابيع	۲۷,۳۰۰	مؤسسة شول للاجهزة والمستلزمات والخدمات المخبرية	١	تامين أنابيب عينات لجهاز الرنين النووي المغناطيسي	٣
المستشفى الجامعي	٣ أشهر	11,190,28	شرمة مكتب الكمال للاستيراد المحدوده	١	تامين أدوية	٣



الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
المستشفى الجامعي	٤ أسابيع	۳۸۱,۱۰٦,۷۵	مؤسسة سعد محمد العدواني للتجارة	١	تأمين الآلات الجراحية للعيادات والأقسام	٣٤
المستشفى الجامعي	٦٠ يوماً	770, 111,01	مؤسسة سعد محمد العدواني للتجارة	١	تأمين أطقم جراحية للعمليات	٣٥
المستشفى الجامعي	۳۰ يوماً	72,	الشركة السعودية للصناعات الدوائية	١	تأمين أدوية	٣٦
كلية العلوم الطبية التطبيقية	١٢أسبوع	٧٧٨,٥٠٠	شركة أصيلا الرياض للتجارة	١	تأمين جهاز متخصص للتنفس الاصطناعي لتدريب الطلاب والطائبات	**
المستشفى الجامعي	۳۰ يوماً	707,	شركة العساف للتقنية والمشاريع	١	تأمين منظمات الأكسجين والهواء والغازات الطبية	٣٨
المستشفى الجامعي	۳۰ يوماً	1.7,801	شركة العساف للتقنية والمشاريع	١	تأمين بعض مستهلكات الأسنان ويعض الآلات الخاصة بعيادات الأسنان	٣٩
المستشفى الجامعي	اسبوعان	٣١,٩٠٠	شركة مخزن الأدوية العربي السعودي	١	تأمين صبغات للأشعة المقطعية	٤٠
المستشفى الجامعي	۳۰ يوماً	1.,.٧٦	مؤسسة سقالة التجارية	١	تأمين أدوية	٤١
المستشفى الجامعي	٢٥ يوماً	۲۷٦,۳۸۳	مستودع النخبة الطبي للأدوية البشرية	١	تأمين أدوية لعيادات الطلاب ومنسوبي الجامعة	٤٢
المستشفى الجامعي	شهر	111,987,87	الشركة السعودية للتوريدات عبدا للطيف بانا جهو شركاه	١	تأمين أدوية للمستشفى الجامعي	٤٣
المستشفى الجامعي	۸ أسابيع	1.9,٧٨.	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة	١	تأمين أدوية	٤٤
المستشفى الجامعي	٣ أسابيع	17,178	شركة مناير للتجارة واللوازم الطبية		تأمين أدوية	٤٥



محروقات وصيانة وسائل النقل والمعدات (٢٢٥) لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	
كلية الصيدلة	٣ أيام	٧٦,٦٩٠	شركة أيرلكد الخفرة للغازات الصناعية	١	تعبئة غازات تشغيل أجهزة المختبرات البحثية	١
المستشفى الجامعي	سنة	1.7,777	الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة	١	صيانة وتأمين قطع غيار لأجهزة التعقيم	۲
كلية التربية للبنات بالخرج	أسبوع	71,70.	شركة مقلة لتجارة الحاسب الآلي	1	تأمين قطع غيار	٣
إدارة الحركة	سنة	191,	شركة زيتي للخدمات البترولية	١	تأمين محروقات وجميع الأعمال الخدمية لوسائط النقل وخلافة	٤
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين	أسبوع	٤,٧٧٠	شركة الهوشان المحدودة		صيانة وإصلاح عدد ٧ آلات تصوير	٥
كليات الجامعة	۸ شهور	177,	مؤسسة صالح حمود الجعيدي للمقاولات		تأمين المياه لكليات الجامعة	٦



كساوي وتجهيزات (٢٢٧) لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
المستشفى الجامعي	١٥ يوماً	187,800	مصنع عباس عبدالله الحسيكي للملابس	١	تأمين بدل طبية ومستلزمات مختلفة	١
عمادة القبول والتسجيل	اسبوعان	112,700	صالح حمد عبدالله الشمالي لبيع المشالح	١	تأمين مشالح لحفل التخرج عدد١٥٢	۲
كلية العلوم الطبية التطبيقية	شهران	04,1	مؤسسة عبدالله محمد الصانع للتجاره	١	تأمين عدد ٨٠٠ بالطو أبيض بالشعار	٣
إدارة الأمن والسلامة	ه٤ يوماً	٦٣,٠٠٠	خياط الاطلال للبدل العسكرية	١	تأمين بدل عدد١٠٠ صيفي و١٠٠ شتوي لحراس الأمن	٤



ترميمات و إضافات لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية الطب	١٠أيام	۸٣,١٢٠	مؤسسة تشييد المعمارية للمقاولات والتجارة	1	تنفيذ أعمال الوحدة الصحية بمستشفى الملك خالد	١
كلية التربية للبنات بالدلم والخرج	٦٠ يوم	709,27 .	شركة تشييد المعمارية	٣	تنفيذ أعمال الطوارئ	۲
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	٥٧ يوماً	٧٧٩,٨٨٤	شركة تشييد المعمارية	١	تنفيذ وإنشاء فصول إضافية	٣
إدارة المشاريع والمصيانة	شهر	197,000	شركة الشمري والشومر للاستشارات الهندسية	١	إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع الفصول الإضافية لعدد (٩) فصول وحضانة أطفال ومستودع حديد وبيت حيوان بالجامعة	٤
كلية التربية بالدلم وكلية العلوم الطبية التطبيقية (للبنات)	۹۰ يوم	۳ ۷۱,۷٦۸	عدة شركات	۲	ترميم مباني	٥
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	۱۰ أيام	Y ,	مؤسسة ألفا للمقاولات	١	تنفيذ أعمال السفلتة	٦
كلية التربية بالدلم وكلية العلوم والدراسات الإنسانية وكلية التربية بالحوطة (للبنات)	أسبوعان	908, * * *	بصمة الدائن للمقاولات والتجارة العامة	1	تنفيذ سواتر	٧
كلية طب الأسنان	۱۰ أيام	79,2	مؤسسة المقاولات العربية للمقاولات	١	تورید وترکیب طبلون کامل مع عمل کل مایلزم مع تمدیدات کهربائیة وتوصیل الکیبل	٨
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل بنين وعمادة القبول والتسجيل	ه٤ يوم	٥٢٨,٧٠٠	عدة شركات	٥	توريد وتركيب كيابل	٩
كلية العلوم والدراسات الإنسانية (أقسام الطلاب) بالخرج	ه٤ يوماً	٦٧,٨٦٠	مؤسسة التميمي للمظلات والسواتر	١	توريد وتركيب مظلات	١٠



ترميمات و إضافات لعام (١٤٣٣هـ)

ا لجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الإنسانية	۱۰ أيام	۲۳,٤٨٠	مؤسسة تشييد المعمارية	١	تنفيذ أعمال مبنى الوحدة الصحية	11
كلية التربية للبنات بالخرج ، كلية التربية بوادي الدواسر	٦٠ يوم	٣٧٨,٠٣٥	عدة شركات	٣	توريد وصيانة مكيفات	17
إدارة المشاريع والصيانة	٥٠ يوماً	٧٥٢,٣٥٠	شركة تشييد البناء المحدوده	١	تنفيذ تعديلات على مبنى كلية التربية بالخرج	۱۳
إدارة المشاريع والصيانة	٥٠ يوماً	797,790	شركة تشييد البناء المحدوده	١	تنفيذ تعديلات على مبنى كلية التربية بالخرج	١٤
إدارة المشاريع والصيانة	۲۰ يوماً	٤٢٢,١٠٠	الزامل لخدمات التكييف والتبريد	١	توريد وصيانة واستبدال قطع غيار محطة رفع المياه المثلجة	10
إدارة المشاريع والصيانة	ه٤ يوماً	£ Y £, V ₹0	شركة تشييد المعمارية	١	تنفيذ اعمال الفصول الإضافية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	١٦
إدارة المشاريع والصيانة	۱۰ أيام	٣٣, ٢٩٠	شركة تكنولوجيا لامة	١	إصلاح وصيانة مكيفات كلية التربية بالدلم	17
إدارة المشاريع والصيانة	۱۰ أيام	۹,۳۲۰	شركة تكنولوجيا لامة	١	توريد وتركيب كيابل كهرباء كلية التربية بالدلم	١٨
إدارة المشاريع والصيانة	٥٥ يوماً	117,7	شركة تشييد المعمارية	1	تنفيذ أعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	19
إدارة المشاريع والمصيانة	١٥ يوماً	191,900	مؤسسة البناء المتقدم	١	ترميم مبنى عمادة القبول والتسجيل	۲٠



ترميمات و إضافات لعام(١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	م
إدارة المشاريع والصيانة	٣ أشهر	707,72.	مؤسسة حماد محمد حمد للمقاولات العامة	١	إنشاء إدارة ملحقة بمقر كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر	۲۱
كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر	٥٠ يوماً	10., 72.	مؤسسة سليل العربية للمقاولات العامة	١	إنشاء ملعب كرة قدم خماسي	77
إدارة المشاريع والصيانة	اسبوعان	97,090	شركة جزيرة الحلول	١	توريد وتركيب وتشغيل شبكة ألياف ضوئية خارجية وشبكة داخلية لمبنى الصيانة والبوابة الرئيسة	74
إدارة المشاريع والصيانة	سنة	٤٠٤,٢١٦	شركة بعد للاتصالات السلكية	١	توريد وتركيب الشبكة الداخلية لكلية التربية بالخرج بنات	7 £
إدارة المشاريع والمصيانة	۱۰ أيام	199,100	مؤسسة البناء المتقدم للمقاولات	١	ترميم وإعادة تأهيل كلية التربية الأقسام العلمية	70
إدارة المشاريع والمصيانة	٦٠ يوماً	۹۸۲,۸٤٠	شركة تشييد المعمارية	١	ترميم كلية التربية بالحوطة بنات	77
إدارة المشاريع والمصيانة	۱۰ أيام	107,10.	شركة تشييد المعمارية	١	إنشاء فصول وقاعات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	**
إدارة المشاريع والصيانة	٦٠ يوماً	199,٧٠٠	مؤسسة البناء المتقدم	١	ترميم وتأهيل المقر السابق لكلية العلوم	47
إدارة المشاريع والصيانة	٦٠ يوماً	998,	شركة تشييد المعمارية	١	ترميم وتأهيل كلية التربية بوادي الدواسر	79
إدارة المشاريع والصيانة	٦٠ يوماً	٣٠٩,٠٣٠	مؤسسة بهجة الافلاج	١	ترميم وتأهيل كلية التربية بالخرج بنات	٣.
إدارة المشاريع والصيانة	٦٠ يوماً	٧٥٥,٨٥٠	مؤسسة البناء المتقدم للمقاولات	١	ترميم كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج بنات	



ترميمات و إضافات لعام(١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
إدارة المشاريع والصيانة	٦٠ يوماً	9,47,121	مؤسسة مدار البناء للمقاولات	١	ترميم كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج	٣١
إدارة المشاريع والصيانة	٦٠ يوماً	979,720	مؤسسة مدار البناء	١	ترميم كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	٣٢
مستودعات الجامعة	۱۰ أيام	17.,007	مؤسسة التقنية الاستشارية للمقاولات	١	تنفيذ اعمال دهان أرضية المستودعين الأول والثاني بمادة الأيبوكسي	٣٣
إدارة المشاريع والصيانة	٥١يوماً	72,	شركة تشييد المعمارية	١	تمهيد الأرض المقابلة لمبنى كلية الهندسة	٣٤
عمادة القبول والتسجيل	ه أيام	۹,۱۰۰	مؤسسة أسوار الدرعية للمقاولات	١	توريد وتوصيل التيار الكهربائي لجهاز الملفات	٣٥
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	١٠ أيام	72,999	شركة تشييد المعمارية	١	تورید وترکیب عدد ۳ طبلون	٣٦
كليات البنات	شهر	٤٥,٩٠٠	مؤسسة أجواء الخرج	١	تورید وترکیب عدد ۱۷ مکیف أسبلیت	٣٧
المدينة الجامعية	۲۰يوماً	17,0**	مؤسسة البنه الوطنية للمقاولات	١	توريد وتركيب \$كيابل وكيبل إيرث خارجي	٣٨
كلية الهندسة والعلوم الطبية بالخرج	١٢٠يوماً	٤٣٨, ٤٠٠	مؤسسة مبارك فهد السويس للمقاولات	١	تنفيذ أعمال وترميم سور كلية الهندسة وكلية العلوم الطبية التطبيقية	٣٩
إدارة الأمن والسلامة	يومان	٦,٤٠٠	شركة تكنولوجيا لامة	١	إصلاح وصيانة مكيفات أكشاك الحراسة	٤٠
عمادة تقنية المعلومات والتعلم عن بعد	١٤يوماً	79,700	شركة تكنولوجيا لامة	١	تورید وترکیب وتشغیل عدد ۱۳۵ مخرج کهرباء لوحدات مکتبیة	٤١



ترميمات و إضافات لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الإنسانية	۸ أيام	14,04.	شركة تكنولوجيا لامة	١	تورید وترکیب عدده۸ مخرج کهرباء مع إمداد کابل لجهاز تقطیر میاه	٤٢
كلية التربية للبنات	أسبوع	٤,٠٥٠	شركة تكنولوجيا لامة	١	إصلاح وصيانة عدد ٢ مكيف صحراوي	٤٣
كليات الجامعة	۷ أيام	70,77	شركة تكنولوجيا لامة	١	تنفيذ أعمال صيانة للمكيفات الصحراوية	٤٤
إدارة ومقرات الجامعة	٥٢يوماً	۲۳,٤٦٠	مجموعة الفيصل لأنظمة الإعلان الحديثة	١	توريد وتركيب لوحات بمسمى جامعة سلمان بن عبدالعزبز	٤٥
إدارة المشاريع والصيانة	ه٤ يوم	۱۸۷,۸۱٤	شركة تشييد المعمارية	١	تنفيذ أعمال ترميم وسلامة بكلية التربية للبنات الخرج	٤٦
إدارة المشاريع والصيانة	۲۵ يوم	۸٠,٧٥٠	شركة تشييد المعمارية	١	تنفيذ اعمال كلية العلوم والدراسات الإنسانية	٤٧
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	٤٠ يوم	7 ,	مؤسسة ألفا للمقاولات	١	أعمال سفلته بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل	٤٨
وكالة الجامعة للشئون التعليمية والأكاديمية	۲۰ یوم	177,70.	مؤسسة تحفة أوغارييت	١	توريد وتركيب قواطع بالصالة التابعة لوكالة الجامعة للشئون التعليمية والأكاديمية	٤٩



خدمات وبرامج الحاسب الآلي والشبكات لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	۸ أسابيع	171,077	شركة أساس التعمير للمقاولات	١	تورید موزع شبکة رئی <i>سي سعة</i> ۲۶ مدخل عدد ۹ لمرکز المعلومات بالمدینة الجامعیة	١
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	سنة	۳۰۱,۱۳٥	شركة جارتنر إيرلندا المحدودة	١	تقديم خدمات توجيه والإرشاد في مجال تقنية المعلومات التعليم عن بعد	۲
كليات الجامعة	٤ أسابيع	٣٦,٤٣٠	شركة زوف للتقنية	١	تامين برنامج الإحصاءات	٣
إدارة المشاريع	ه أيام	09,970	مكتب الثلاثي للاستشارات الهندسية	١	توريد وتشغيل برنامج حاسب آلي للمراجعة الانشائية	٤
عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد	۸ أسابيع	107,017	شركة أساس التعمير للمقاولات	١	تورید موزع شبکة رئیس سعة ۲۶ مدخلاً عدد ۸ لمرکز المعلومات بالمدینة الجامعیة	0



تورید کتب ومراجع بند (۱/۲۲۲) لعام (۱٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
مكتبات الجامعة	أسبوع	1.,0	صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز	,	توريد كتاب كوكب واحد	١
كليات الأفلاج	١٤ أسبوعاً	TE+, Y1A	مؤسسة دار العرب لنشر والتوزيع	١	توريد كتب ومراجع	۲
كليات الخرج	١٤ أسبوعاً	070,177	مؤسسة دار العرب لنشر والتوزيع	١	توريد كتب ومراجع	٣
كليات وادي الدواسر والسليل	١٤ أسبوعاً	701,791	مؤسسة دار العرب لنشر والتوزيع	١	توريد كتب ومراجع	٤



العقود الاستشارية لعام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
المدينة الجامعية (إدارة المشاريع والصيانة)	٣سنوات	0,9.8,	مكتب التنمية للاستشارات الهندسية	١	تأهيل مباني الجامعة والبنية التحتية	١
إدارة المشاريع والصيانة	شهران	1,700,000	مكتب مستشار للاستشارات الهندسية	١	تصميم مشروع مركز الطالبات بالهياثم	۲
إدارة المشاريع والصيانة	ەئيوماً	108,	شركة التربة والأساسات المحدوده	١	مشروع فحص وتحليل التربة لمشاريع الجامعة	٣
إدارة المشاريع والصيانة	ەئيوماً	17,4	شركة التربة والأساسات المحدوده	١	مشروع فحص وتحليل التربة لإنشاء فصول إضافية لكلية التربية للبنات بالحوطة	٤



تشغيل واستثمار مركز خدمات الطالب عام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الإنسانية والسنة التحضيرية	سنة	17,0	مؤسسة الإشراق الجامعي	١	تشغيل و استثمار خدمات الطالب	١
كلية التربية للبنات بالخرج	سنة	77,.V0	مؤسسة روائح الياسمين للتجارة	١	تشغيل و استثمار خدمات الطالب	*
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بنات بالخرج	سنة	77,770	مؤسسة روائح الياسمين للتجارة	١	تشغيل و استثمار خدمات الطالب	٣
كلية التربية بنات بالحوطة	سنة	۲۳, ٤٥٠	مؤسسة روائح الياسمين للتجارة	١	تشغيل و استثمار خدمات الطالب	٤
كلية العلوم الطبية التطبيقية بنات بالخرج	سنة	0,07.	مؤسسة روائح الياسمين للتجارة	١	تشغيل و استثمار خدمات الطالب	٥
كلية التربية بنات بالدلم	سنة	۲۷,٦٣٠	مؤسسة روائح الياسمين للتجارة	١	تشغيل و استثمار خدمات الطالب	٦
كلية المجتمع بنين بالخرج	سنة	٦,٠٠٠	مؤسسة تورية للقرطاسية	1	تشغيل و استثمار خدمات الطالب	٧
كلية إدارة الأعمال وكلية هندسة وعلوم الحاسب بنين بالخرج	سنة	٦,٠٠٠	مؤسسة تورية للقرطاسية	١	تشغيل و استثمار خدمات الطالب	٨



تشغيل واستثمار بوفيهات الكليات عام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عددالتعاميد	اسم العملية	۴
كلية العلوم والسنة التحضيرية والقبول	٣ سنوات	141,.0.	مؤسسة ريوق الخير	١	تشغيل بوفيه	١
كلية العلوم الطبية بنات وبنين وكلية الهندسة بنين الخرج	٣ سنوات	14.,	شركة القيمة العالية	١	تشغيل بوفيه	۲
كلية الدلم بنات وكلية الطب بنيين بالخرج	٣ سنوات	٥٠٤,٠٠٠	شركة القيمة العالية	1	تشغيل بوفيه	٣
كلية العلوم بنات وكلية ادارة الاعمال وكلية هندسة وعلوم الحاسب بنيين الخرج	۳ سنوات	000,***	شركة القيمة العالية	١	تشغيل بوفيه	٤
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بنين وبنات بالحوطة	٣ سنوات	۲۳۸,۰۰۰	مؤسسة عبدالله الهويدي	١	تشغيل بوفيه	٥
كلية التربية بالخرج بنات وكلية المجتمع بنين	٣ سنوات	٥٧٩,٠٠٠	مؤسسة هيام الموسى	١	تشغيل بوفيه	٦
كلية العلوم بنين وبنات وكلية المجتمع بالأفلاج	٣ سنوات	٣٣٩,٠٠٠	مؤسسة عبدالله آل مفلح	١	تشغيل بوفيه	٧
كلية التربية بنات وكلية التربية والهندسة بنين بوادي الدواسر	٣ سنوات	۳۷۳,۰۰۰	مؤسسة سعيد آل محاصر	١	تشغيل بوفيه	٨
كلية الآداب والعلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية بنات وكلية الاداب والعلوم بنيين بوادي الدواسر	۳ سنوات	79.,	مؤسسة سعيد آل محاصر	,	تشغيل بوفيه	٩
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بنين وبنات بالسليل	۳ سنوات	1.7,0	مؤسسة سعيد آل محاصر	١	تشغيل بوفيه	١٠



تشغيل واستثمار بوفيهات الكليات عام (١٤٣٣هـ)

الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم والدراسات الانسانية بنين وبنات بالسليل	٣ سنوات	77,	مؤسسة سعيد آل محاصر	١	تشغيل كافي	١
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بنات وكلية المجتمع وكلية العلوم والدراسات بنين بالأفلاج	۳ سنوات	0.,40.	مؤسسة عبدالله آل مفلح	١	تشغيل كافي	۲
كلية إدارة الأعمال بنيين وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بنات بالحوطة	٣ سنوات	09,70.	مؤسسة عبدالله الهويدي	١	تشغيل كافي	٣
كلية التربية بالدلم وكلية طب الأسنان بنين بالخرج	٣ سنوات	۱۸۳,۰۰۰	ک <i>في</i> المشاهير	١	تشغيل كافي	٤
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بنات وكلية إدارة الأعمال وكلية هندسة وعلوم الحاسب	۳ سنوات	١٨٣,٠٠٠	كفي المشاهير	١	تشغيل كافي	٥
كلية العلوم الطبية التطبيقية بنات وبنات وكلية الهندسة بنين بالخرج	۳ سنوات	٣٩,٠٠٠	کفي ا لمشاهير	١	تشغيل كافي	٦
كلية العلوم والدراسات الإنسانية والسنة التحضيرية والقبول والتسجيل	٣ سنوات	104, * * *	د. مزاج	١	تشغيل كافي	٧
كلية التربية بنات وكلية التربية وكلية الهندسة بنين بوادي الدواسر	۳ سنوات	٦٠,٠٠٠	شركة القيمة العالية	1	تشغيل كافي	٨
كلية الآداب والعلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية بنات وكلية الآداب والعلوم بنين بوادي الدواسر	۳ سنوات	٦٠,٠٠٠	شركة القيمة العالية	١	تشغيل كافي	٩
كلية التربية بالخرج بنات وكلية المجتمع بنين بالخرج	۳ سنوات	727,	شركة القيمة العالية	١	تشغيل كافي	1.



تورید معدات و سیارات لعام (۱٤٣٣هـ)


الجهات المستفيدة	المدة	قيمة العملية	اسم الشركة/المؤسسة	عدد التعاميد	اسم العملية	م
إدارة النقل قسم الحركة	شهران	127, ***	شركة الموسى والرشيد للسيارت	١	تأمین عدد (۲) هایلوکس ۲۰۱۲م	١
إدارة النقل قسم الحركة	شهران	٤٨,٠٠٠	شركة الموسى والرشيد للسيارت	١	تأمین سیارة تویوتا یاریس عدد (۱) ۲۰۱۲م	۲
كلية الصيدلة	أسبوع	۲۰۷,۸۰۰	الخريجي للتجارة والالكترونيات	1	تأمين مولد كهربائي احتياطي للطوارئ	٣
إدارة العلاقات	ه أيام	٧١,٠٠٠	شركة اللمحات العصرية لفن المعارض	١	تامین سیارة جولف ٦ راکب وطباعة عدد٧بوب اب	٤



خدمات الأمن والسلامة لعام (١٤٣٣هـ)


الجهات المستفيدة	المدة	اسم الشركة/المؤسسة قيمة العملية		عدد التعاميد	اسم العملية	م
كلية العلوم الدراسات الإنسانية (الطالبات)	۲۰ يوماً	104,7	شركة أساس التعمير للمقاولات	١	توريد وتركيب سلائم لمخارج الطوارئ	١
كلية المجتمع بالحرم الجامعة	ه٤ يوماً	911,900	شركة أساس التعمير للمقاولات	١	توريد وتركيب كامرات أمنية	۲
كلية العلوم والدراسات الإنسانية (الطالبات)	٦٠ يوماً	٧٨٨,٧٧٤	شركة أساس التعمير للمقاولات	١	توريد وتركيب نظام الإندار المبكر للحريق	٣
كلية التربية للبنات بالخرج	٦٠ يوماً	۸۹۱,۹۵۰	مؤسسة إمدادات للتجارة	١	توريد وتركيب نظام مكافحة الحريق	٤
إدارة الأمن والسلامة	سنة	۲۰۳,۷٦۰	شركة الإتصالات العامة	1	تجديد إشتراك (١٥٠) خط برافو لخدمات الأمن والسلامة بالجامعة	٥
إدارة المشاريع والصيانة وإدارة والامن والسلامة	٣ أشهر	٣٩٨,٨٠٠	مجموعة دائرة التحكم	١	تورید وترکیب عدد ۱۳۰فورة العین و ۱۵دش سلامة و ۱۰۰ بطانیة	٦



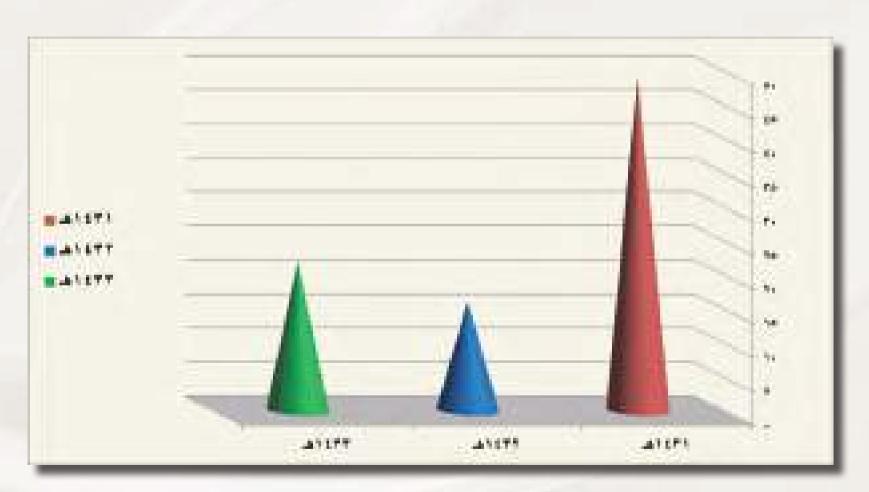


رسم بياني يوضح عمليات التأمين المباشر (التعاميد) في الأعوام ١٤٣١ هـ - ١٤٣٣هـ - ١٤٣٣هـ



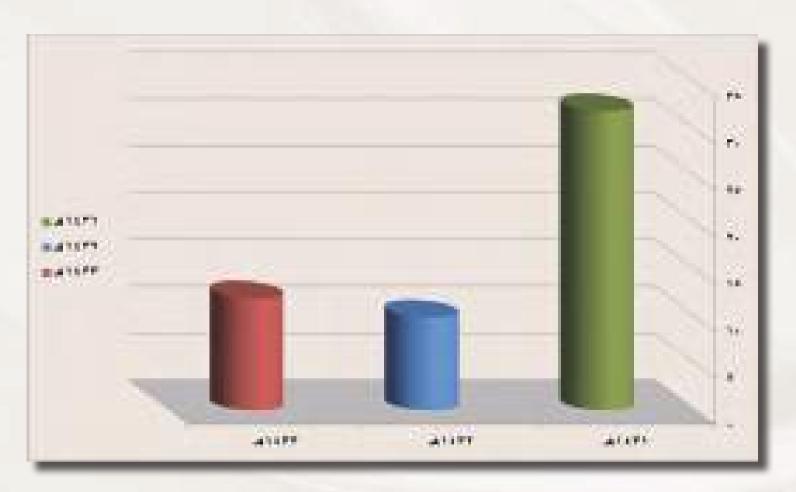

رسم بياني يوضح عدد المعامل التي تم تأمينها (جَهيزها) في الأعوام ١٤٣١ هـ - ١٤٣٣هـ - ١٤٣٣هـ



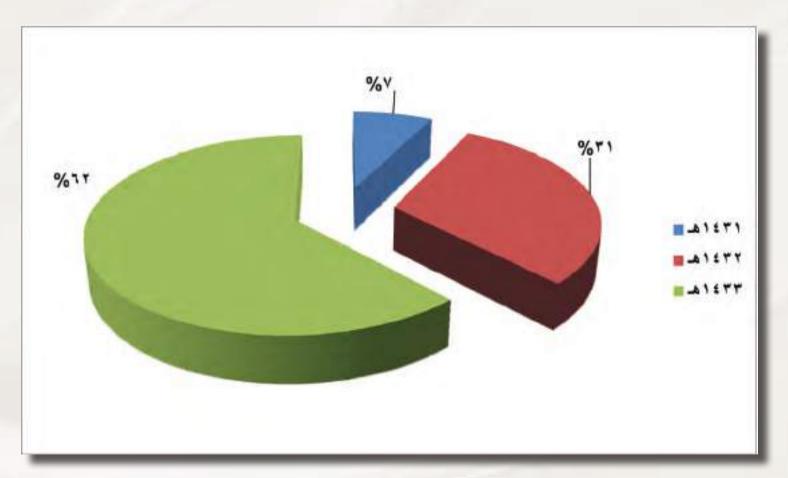

رسم بياني عثل النسبة المئوية لأعمال الترميمات في الأعوام ١٤٣١ هـ - ١٤٣١هـ - ١٤٣٣هـ

